

(工事名) 上信越自動車道 蓬平工事

対 象	誤	正	備 考
<p>参考図 表紙</p>	<p style="text-align: center;">新 規</p>	<p style="text-align: center;">上 信 越 自 動 車 道 蓬 平 工 事</p> <p style="text-align: center;">参 考 図</p> <p style="text-align: center;">平成29年 5月</p> <p style="text-align: center;">東日本高速道路株式会社 関東支社長野管理事務所</p>	
<p>参考図 目次</p>	<p style="text-align: center;">新 規</p>	<p style="text-align: center;">目 次</p> <p style="text-align: right;">頁</p> <p style="text-align: center;">1. 施エスナップ図 (1/8) ~ (8/8) (参考図) ..... 1 ~ 8</p>	

(工事名) 上信越自動車道 蓬平工事

対象	誤	正	備考
<p>参考図 施工ステップ図(1/8)</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">新規</p>	<p style="text-align: center;">施工ステップ図 (1/8) (参考図) <span style="float: right;">1 / 8</span></p> <p>STEP0: 現況</p> <p>STEP1: 中央分離帯改良 (橋脚改築区間中央分離帯防護柵置き式の防護柵に変更) 橋脚アンカー切断</p> <p>STEP2: 中央分離帯防護柵を橋脚へ移動、既設防護柵撤去・併用区間ヤードへ移動 併用区間ヤードへ移動</p> <p>STEP3: 土留め杭打設</p>	
<p>参考図 施工ステップ図(2/8)</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">新規</p>	<p style="text-align: center;">施工ステップ図 (2/8) (参考図) <span style="float: right;">2 / 8</span></p> <p>STEP4: 下り線路肩直設防護柵設置 経路及び土留め支保工、併用区間ヤード撤去、既設排水管埋設工</p> <p>STEP5: 下り線(兼行側)原形防護柵撤去、下り線のみ着完了後路肩工、橋脚工</p> <p>STEP6: 下り線路面標示工・ラバーコーン設置 (車線シフト準備)</p> <p>STEP7: 既得えにて下り線車線シフト</p>	

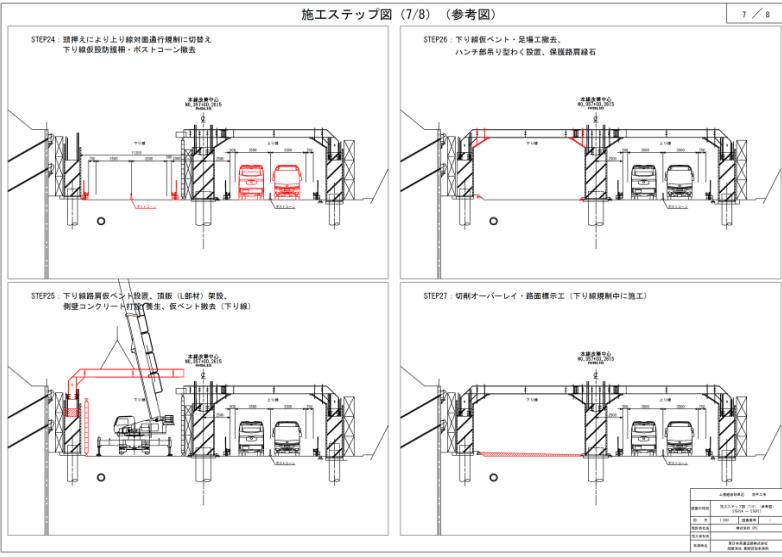
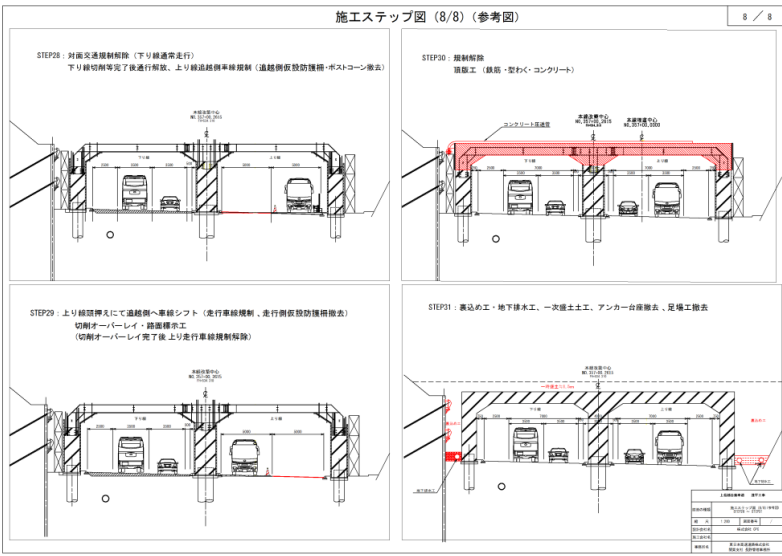
(工事名) 上信越自動車道 蓬平工事

対 象	誤	正	備 考
<p>参考図 施工ステップ図(3/8)</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">新 規</p>	<p style="text-align: center;">施工ステップ図 (3/8) (参考図) <span style="float: right;">3 / 8</span></p> <p>STEP9: 上下線誤押えにて車線シフト</p> <p>STEP10: 上下線路肩側鋼管圧入機搬入準備</p> <p>STEP11: 上下線路肩側鋼管圧入機(システム)組立て・圧入</p>	
<p>参考図 施工ステップ図(4/8)</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">新 規</p>	<p style="text-align: center;">施工ステップ図 (4/8) (参考図) <span style="float: right;">4 / 8</span></p> <p>STEP12: 鋼管圧入 (側型) (上下線) 鋼管圧入機解体・側壁足場・型枠組立、仮設防護柵設置 (上下線路肩側)</p> <p>STEP13: 支保工 高硬コンクリート 側壁工(鉄骨・型枠・コンクリート)打設・養生 (上下線)</p> <p>STEP14: 上下線誤押え 足場工撤去、上下線路肩側仮設防護柵移動 上下線誤押えにて車線シフト</p> <p>STEP15: 中央分離帯規制、中央部仮設防護柵移動</p>	

(工事名) 上信越自動車道 蓬平工事

対象	誤	正	備考
<p>参考図 施工ステップ図(5/8)</p>	<p>新規</p>	<p>施工ステップ図 (5/8) (参考図)</p> <p>STEP16: 鋼管圧入機 (541A) 組立・圧入 (中壁)・仮設防振柵設置 STEP17: 鋼管圧入 (中壁) STEP18: 鋼管圧入機撤去・中壁足場・定礎工・基礎コンクリート・中壁工 (鉄筋・型枠・コンクリート打設・養生)・仮ベント設置・下り検封固交通規制準備 STEP19: 下り検封固交通規制準備・ポストコーン設置</p>	
<p>参考図 施工ステップ図(6/8)</p>	<p>新規</p>	<p>施工ステップ図 (6/8) (参考図)</p> <p>STEP20: 図例4により下り検封固交通規制 中壁 (丁部材) 撤去・中壁コンクリート打設/養生 上り検封固撤去 STEP21: 上り検封固部仮ベント設置・頂版 (L部材) 架設・仮鉄筋配置等工・中壁コンクリート打設/養生・仮ベント撤去 (上り検) STEP22: ハンチ部布り型枠・假設路肩橋石工 STEP23: 上り検封固交通規制準備・仮設防振柵設置・ポストコーン設置</p>	

(工事名) 上信越自動車道 蓬平工事

対 象	誤	正	備 考
<p>参考図 施工ステップ図(7/8)</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">新 規</p>	<p style="text-align: center;">施工ステップ図 (7/8) (参考図) <span style="float: right;">7 / 8</span></p>  <p>STEP24: 踏掛えにより上り線対面通行規制に切替え 下り線仮設防護柵・ポストコーン撤去</p> <p>STEP25: 下り線踏掛えベント設置、頂版(L部材)架設、 側壁コンクリート打設(養生、仮ベント撤去(下り線))</p> <p>STEP26: 下り線仮ベント・足場工撤去、 ハンチ部吊り繋ぐ設置、保線路開通</p> <p>STEP27: 切替オーバーレイ・路床標示工(下り線規制中に施工)</p>	
<p>参考図 施工ステップ図(8/8)</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">新 規</p>	<p style="text-align: center;">施工ステップ図 (8/8) (参考図) <span style="float: right;">8 / 8</span></p>  <p>STEP28: 対面交通規制解除(下り線通常走行) 下り線切替等完了後通行解除、上り線道路側面歩道規制(道路側仮設防護柵・ポストコーン撤去)</p> <p>STEP29: 上り線踏掛えにて道路側へ車線シフト(走行車線規制、先行側仮設防護柵撤去) 切替オーバーレイ・路床標示工 (切替オーバーレイ完了後上り走行車線規制解除)</p> <p>STEP30: 規制解除 撤去工(養生・型枠・コンクリート)</p> <p>STEP31: 渡込め工・地下水工、一次盛土工、アンカー台座撤去、足場工撤去</p>	
