

平成29年2月24日
東日本高速道路株式会社
佐久管理事務所

上信越自動車道 横川サービスエリア(上下線)

駐車場一部利用制限のお知らせ

NEXCO東日本 佐久管理事務所(長野県佐久市)では、より安全で快適に休憩施設をご利用いただくため、上信越自動車道横川サービスエリア(上下線)の駐車場のバリアフリー化及び舗装補修工事を実施しております。

工事期間中は、駐車場等を一部利用制限して工事を実施するため、お客さまにご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

なお、お手洗い、商業施設については通常通りご利用いただけます。

1. 工事期間

横川サービスエリア 下り線：平成28年9月上旬～平成29年3月下旬まで

上り線：平成29年1月上旬～平成29年7月下旬まで

なお、土曜・日曜・祝日については工事を行いません。

2. 工事箇所

群馬県安中市松井田町横川



3. 工事内容等

駐車場のバリアフリー化工事を行います。工事期間中(平日)は、工事範囲を分割して(ステップ1～13)昼夜連続規制を行いながら順次工事を実施します。 【工事ステップ:別紙】




4. 工事中利用可能施設

工事にともない駐車場等を一部利用制限いたしますが、下記の施設については利用可能です。

- お手洗い
- 商業施設(売店やスナックコーナー、レストラン等)


【下り施工ステップ図】

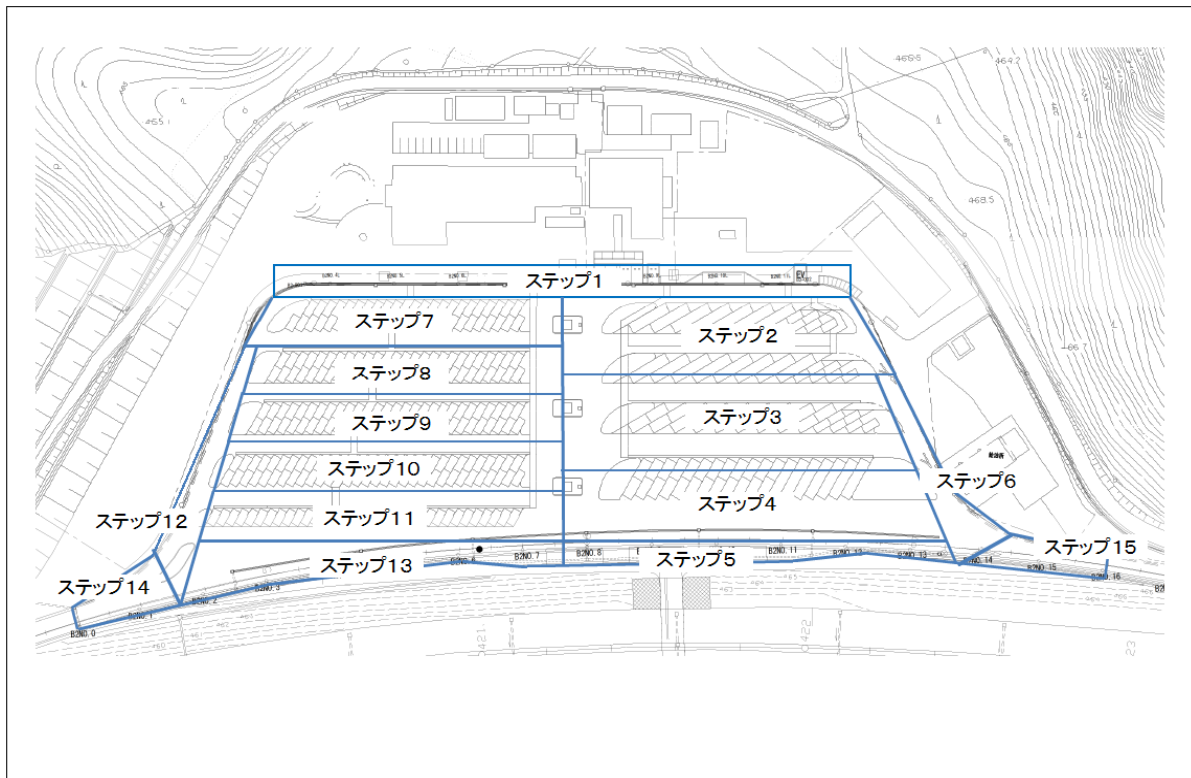

施工ステップ・ブロック	施工内容	備考
ステップ1	水路工事	完了
ステップ2	舗装工事	完了
ステップ3	舗装工事	完了
ステップ4	舗装工事	完了
ステップ5	舗装工事	完了
ステップ6	舗装工事	完了
ステップ7	舗装工事	施工中
ステップ8	舗装工事	施工中
ステップ9	舗装工事	施工中
ステップ10	舗装工事	施工中
ステップ11	舗装工事	施工中
ステップ12	舗装工事	施工中
ステップ13	舗装工事	施工中
ステップ14	舗装工事	予定
ステップ15	舗装工事	予定

※現地点での予定であり、天候により工事ができない場合には延期する場合があります。

【上り施工ステップ図】

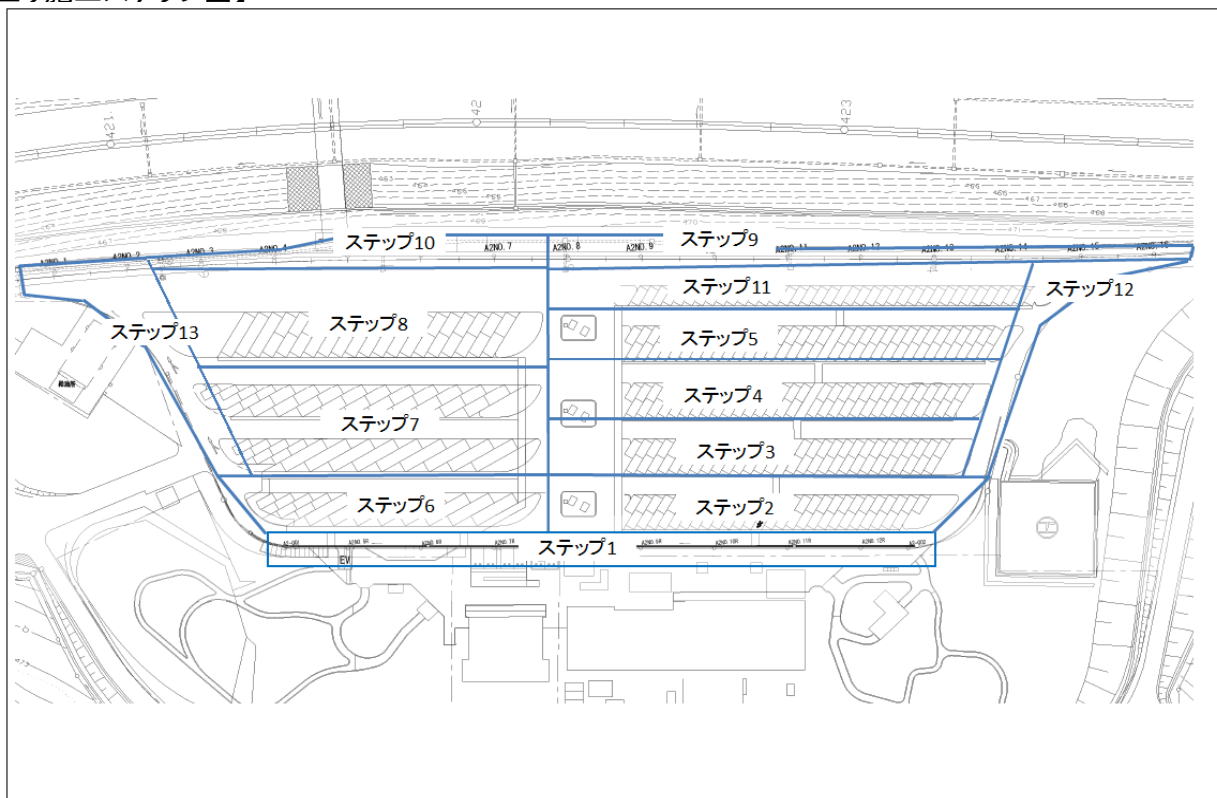

施工ステップ・ブロック	施工内容	備考
ステップ1	水路工事	施工中
ステップ2	舗装工事	施工中
ステップ3	舗装工事	施工中
ステップ4	舗装工事	施工中
ステップ5	舗装工事	予定
ステップ6	舗装工事	予定
ステップ7	舗装工事	予定
ステップ8	舗装工事	予定
ステップ9	舗装工事	予定
ステップ10	舗装工事	予定
ステップ11	舗装工事	予定
ステップ12	舗装工事	予定
ステップ13	舗装工事	予定

※現地点での予定であり、天候により工事ができない場合には延期する場合があります。
