

<事象概要>

被災箇所 : E6常磐道(相馬IC~新地IC)
暫定2車線区間 268.9KP

地震発生日時 : 2月13日(土) 23時07分


崩落規模 : 幅70m × 高さ15m × 奥行10m (約5,000m³)

人的被害 : 無し


【位置図】



【横断図】

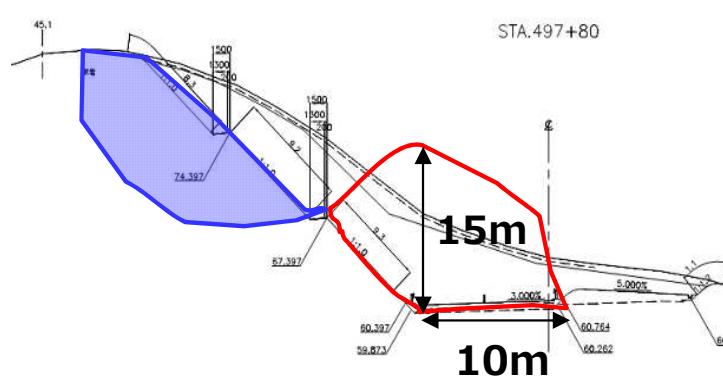

【被災状況】

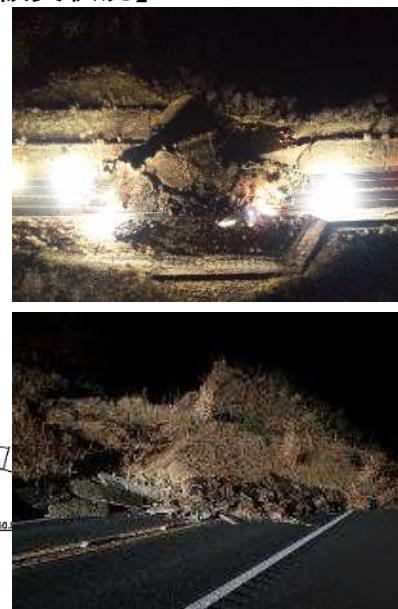

<現在の作業状況>

○現場体制 : バックホウ7台、ブレーカー1台
ダンプトラック32台

○作業状況 : 被災直後から土砂の撤去作業を実施
現在、亀裂が見られる残存岩塊の撤去・搬出中

【作業状況】



2/16(火)7:00時点



2/16(火)7:00時点

<今後の見通し>

○15日(月)にのり面の安全性について有識者に現場を確認頂いた。

○有識者の意見を踏まえて必要な対策を実施した上で、17日(水)中に、通行止めを解除する予定。

