

<事象概要>

被災箇所 : E6常磐道 (相馬IC~新地IC) 268.9KP
 地震発生日時 : 2月13日 (土) 23時07分
 崩落規模 : 幅70m×高さ15m×奥行10m (約5,000m³)


<現在の作業状況>

- 現場体制 : バックホウ7台
 ダンプトラック32台
- 作業状況 : 崩落土砂および岩塊を搬出中

【位置図】




【平面図】

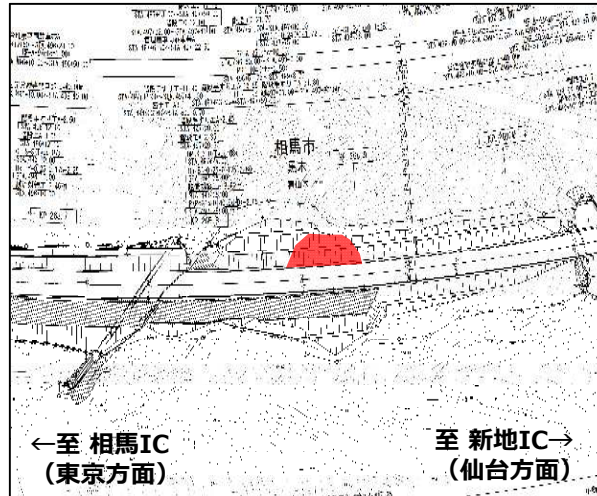

【作業状況】



【横断面図】

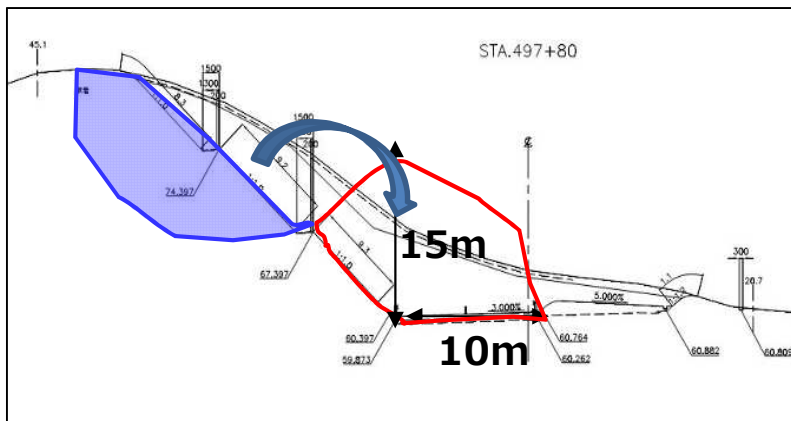

【被災状況】



<今後の見通し>

- 土砂を排土する作業ヤードが狭い中、最大限の機械を投入し土砂撤去作業中
- 速やかに緊急車両の通行路確保を目指す
- 土砂撤去作業完了後、大型土のう設置、ブルーシート設置、舗装補修を行い早期の通行止め解除を目指す
