

東北自動車道

R9 青森管内舗装補修工事

参 考 図

- この参考図は、入札参加者の適正かつ迅速に資するための資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- 参考図は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、当該工事の競争参加者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- この参考図の内容に関する質問は受け付けない。

令和 8 年 10 月


東日本高速道路株式会社 東北支社

青 森 管 理 事 務 所


目次

1. 試験舗装位置図	・・・・・・・・・・・・・・・・	1	
2. 交通規制エタイムテーブル	・・・・・・・・・・・・・・・・	2	～ 10

試験舗装位置図（参考図）

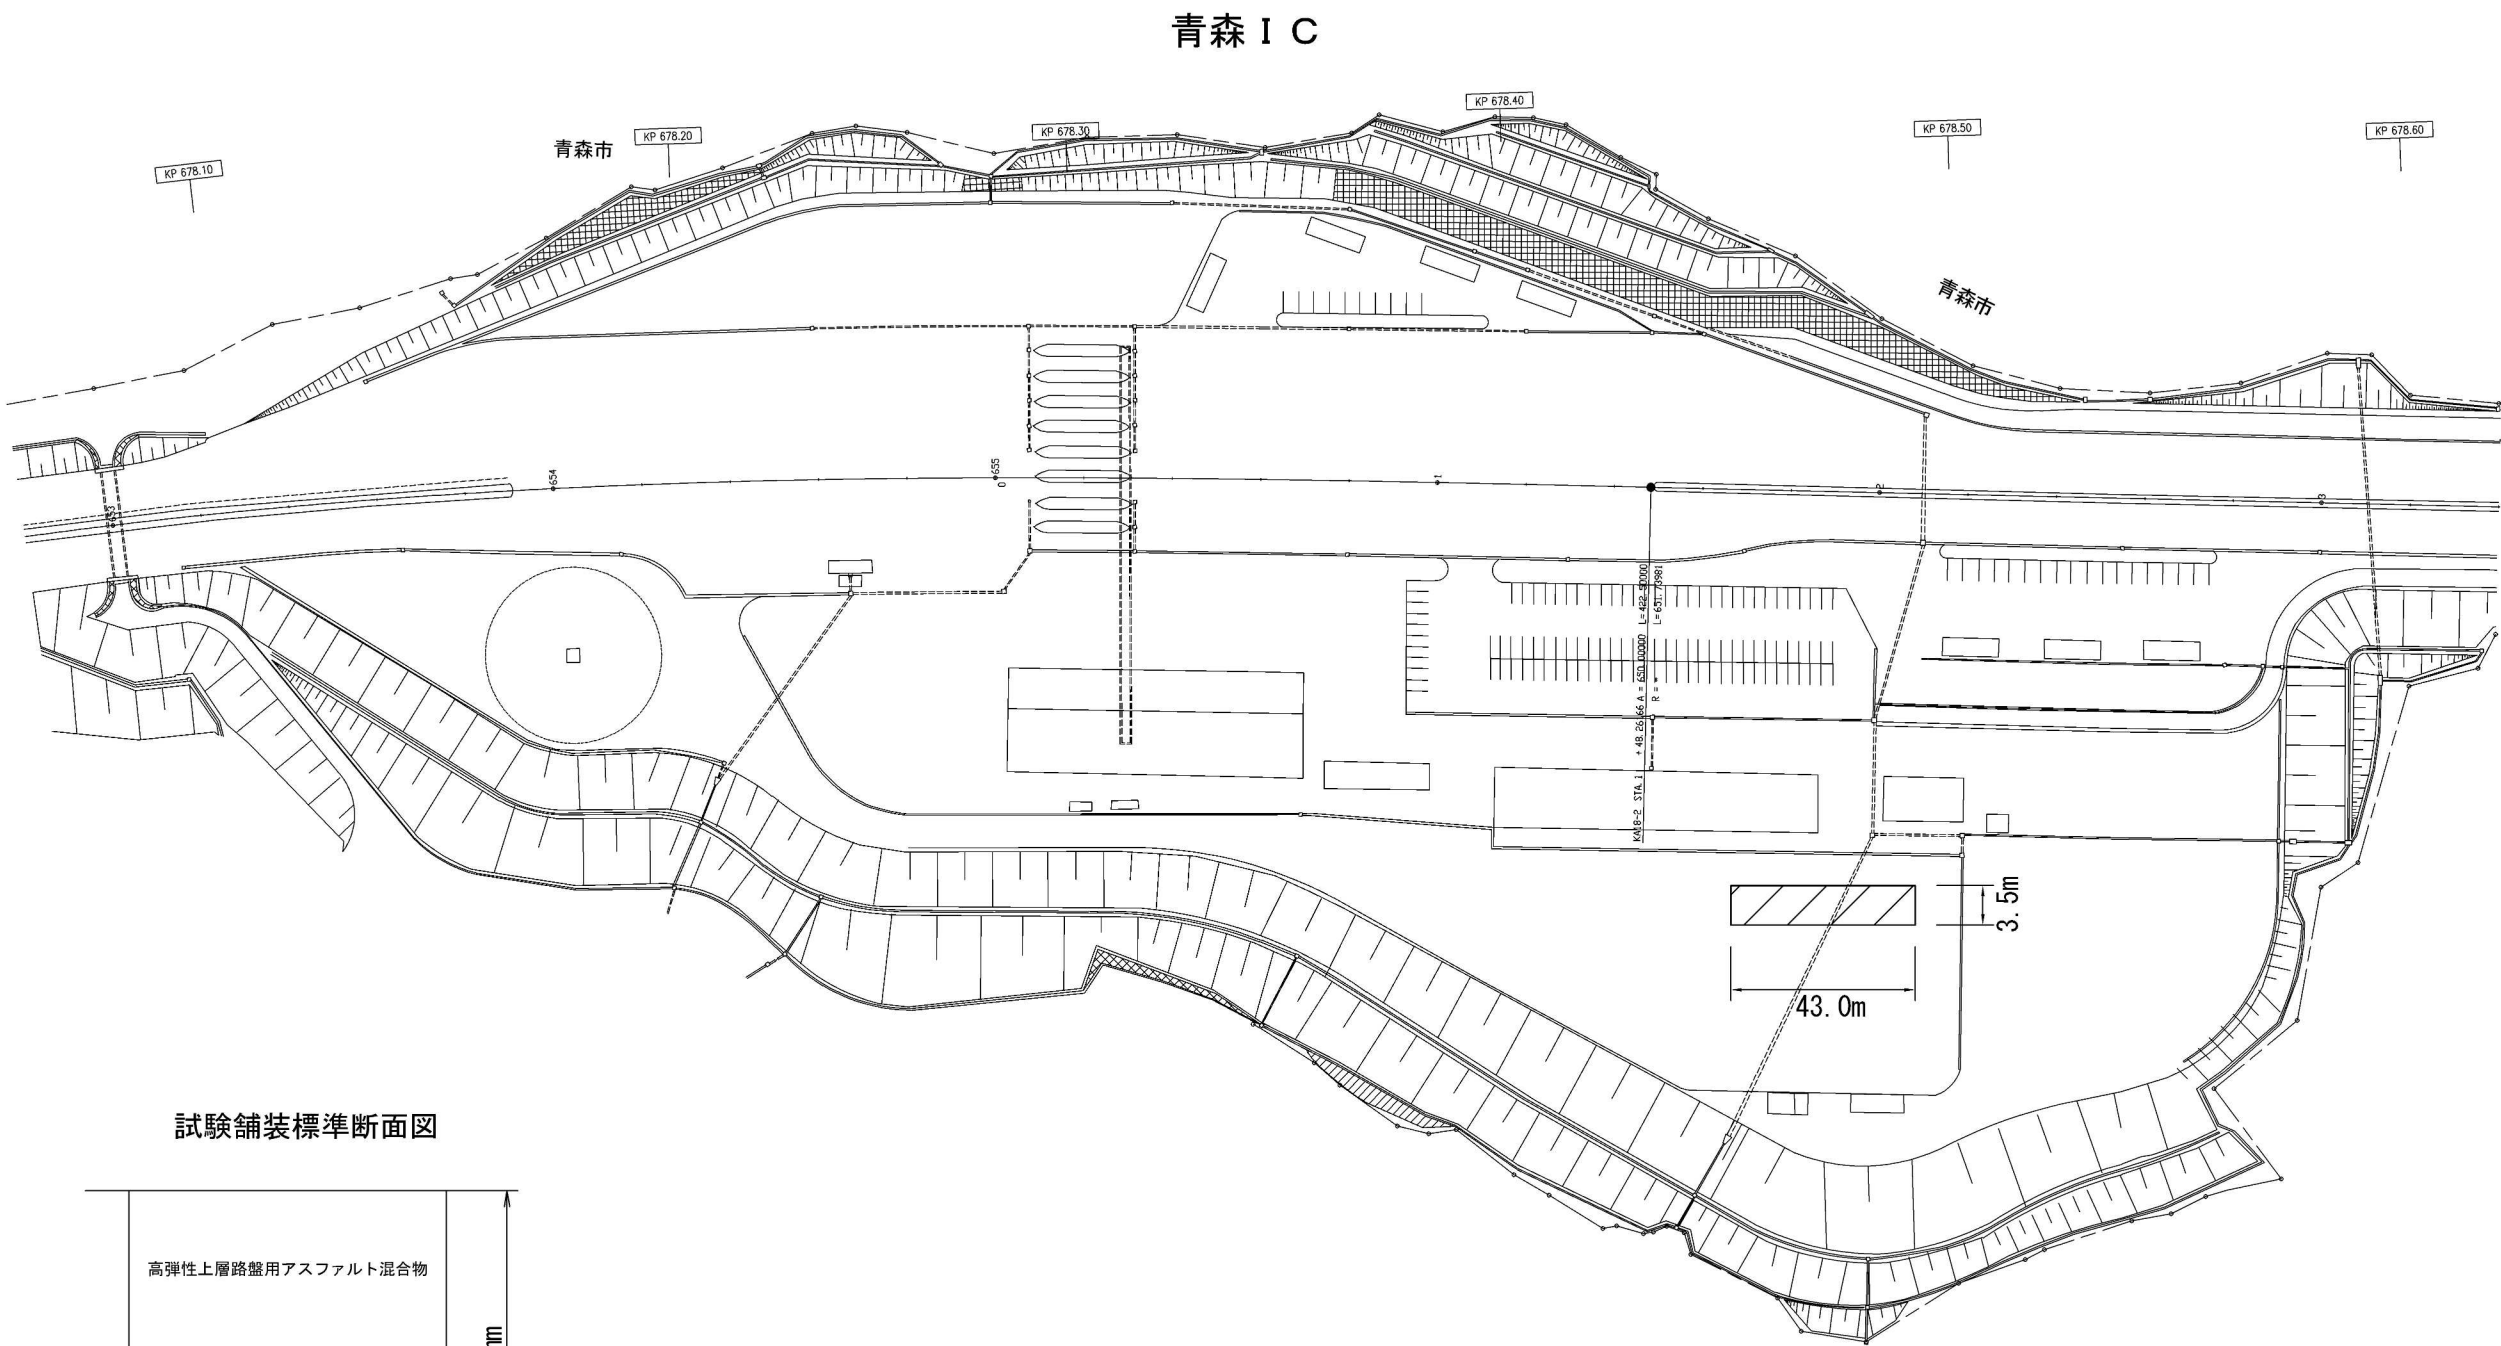

試験舗装標準断面図

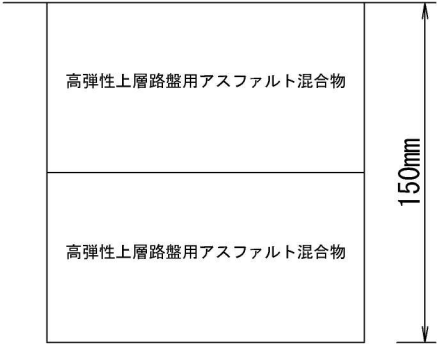

	東北自動車道 R 9 青森管内舗装補修工事		
図面の種類	試験舗装位置図（参考図）		
縮 尺	—	図面番号	
設計会社名			
施工会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社 東北支社 青森管理事務所		

交通規制エタイムテーブル(1)
交通規制工 車線規制B1(東北道)

規制保守 開始 8:00
終了 15:30 規制の保守時間：7.50時間

作業内容		所要時間	時刻																							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
規制時間																										
拘束時間																										
準備（規制材の積み込み等）		60 分																								
規制材設置	基地から規制箇所までの移動	30 分																								
	規制材設置	60 分																								
	標識	(25 分)																								
	テープ	(20 分)																								
	ラバコン	(15 分)																								
規制保守時間																										
規制材撤去	規制撤去前の点検等	30 分																								
	規制材撤去	60 分																								
	標識	(25 分)																								
	テープ	(20 分)																								
	ラバコン	(15 分)																								
	規制箇所から基地までの移動	30 分																								
	後片付け	30 分																								
労務編成	1 班 目	実働時間	540 分																							
		開始 5:30																								
		終了 14:30																								
		移動等	60 分																							
	2 班 目	実働時間	330 分																							
		開始 12:30																								
		終了 18:00																								
		移動等	60 分																							

交通規制エタイムテーブル(2)
交通規制工 車線規制C1(東北道)

規制保守 開始 8:00
終了 14:30 規制の保守時間：6.5時間

作業内容		所要時間	時刻																			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
規制時間																						
拘束時間																						
準備（規制材の積み込み等）		60 分																				
規制材設置	基地から規制箇所までの移動	30 分																				
	規制材設置	60 分																				
	標識	(25 分)																				
	テーパー	(20 分)																				
	ラバコン	(15 分)																				
規制保守時間																						
規制材撤去	規制撤去前の点検等	30 分																				
	規制材撤去	60 分																				
	標識	(25 分)																				
	テーパー	(20 分)																				
	ラバコン	(15 分)																				
	規制箇所から基地までの移動	30 分																				
	後片付け	30 分																				
労務編成	1 班 目	実働時間	540 分																			
		開始 5:30																				
		終了 14:30																				
		移動等	60 分																			
	2 班 目	実働時間	270 分																			
		開始 12:30																				
		終了 17:00																				
		移動等	60 分																			

交通規制工タイムテーブル(3)
交通規制工 連続車線規制C4(東北道)

観劇保守 初日開始時刻 18:00
最終日終了時刻 15:00

		時刻			時間																											
		作業内容	所要時間	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3					
		タイムテーブル（設置日）		深夜の始業率（22時～5時）																												
		観劇開始																														
		拘束時間																														
		準備（座席材の積み込み等）	60分																													
		規制（基地から観劇場所までの移動）	30分																													
		観劇材料搬入	60分																													
		座席	(25分)																													
		テーブル	(20分)																													
		ラバコン	(15分)																													
		観劇保守時間	工事稼働中																													
		観劇前立会の点検等	30分																													
		観劇材料撤去	60分																													
		座席	(25分)																													
		テーブル	(20分)																													
		ラバコン	(15分)																													
		観劇場所から基地までの移動	30分																													
		後片付け	30分																													
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																			
労務 構成	実施時間		540分																													
	観劇 日	開始 5:30																														
		終了 14:30																														
	移動等		60分																													
	参加人数		5名																													
	実施時間		540分																													
	観劇 日	開始 12:30																														
		終了 21:30																														
	移動等		各60分																													
	参加人数		2名																													
	実施時間		540分																													
	観劇 日	開始 19:30																														
		終了 4:30																														
	移動等		各60分																													
	参加人数		2名																													
	実施時間		540分																													
	観劇 日	開始 2:30																														
		終了 11:30																														
	移動等		60分																													
	参加人数		5名																													

			時刻																												
作業内容 タイムテーブル（中項目）			所要時間	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3				
規制時間																															
拘束時間																															
準備（規制村の読み込み等）			60分																												
規 則 基地から規制箇所までの移動			30分																												
制 所 規制村設置			60分																												
材 機 具 機 具			(25分)																												
置 テーパー			(20分)																												
ラバコン			(15分)																												
規制保守時間			工事稼働時 工事不稼働時																												
規制撤去前の点検等			30分																												
規制材搬去			60分																												
機 具 機 具			(25分)																												
材 テーパー			(20分)																												
撤 去 ラバコン			(15分)																												
規制箇所から基地までの移動			30分																												
後片付け			30分																												
			9																												
労務構成	3 項目	実働時間 開始 19:30 終了 4:30	540分																												
		移動等	60分																												
		編成人数 2名	540分	2	3	4	5	6	7	8	9																				
	4 項目	実働時間 開始 2:30 終了 11:30	540分																												
		移動等	60分																												
		編成人数 5名	540分	0	1	2																									
	5 項目	実働時間 開始 9:30 終了 18:30	540分																												
		移動等	各60分																												
		編成人数 5名	540分	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
	6 項目	実働時間 開始 16:30 終了 1:30	540分																												
		移動等	各60分																												
		編成人数 2名	540分																												
7 項目	実働時間 開始 23:30 終了 8:30	540分																													
	移動等	60分																													
	編成人数 2名	540分																													

作業内容		所要時間	時刻																											
タイムテーブル（中目目）			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3				
深夜																														
規制期間																														
作業時間																														
準備（規制材の搬込み等）			60分																											
規制材設置	基地から規制箇所までの移動		30分																											
	規制材設置		60分																											
	標識		(25分)																											
	テーパー		(20分)																											
ラバコン		(15分)																												
規制保守時間																														
工事開始時																														
工事不要臨時																														
規制材撤去	規制箇所の点検等		30分																											
	規制材撤去		60分																											
	標識		(25分)																											
	テーパー		(20分)																											
	ラバコン		(15分)																											
	規制箇所から基地までの移動		30分																											
後片付け			30分																											
分割縮成	7日間目	実施時間	540分																											
		開始	23:30																											
		終了	8:30																											
	8日間目	移動等	60分																											
		縮込人数	2名																											
		実施時間	540分																											
	9日間目	開始	6:30																											
		終了	15:30																											
		移動等	各60分																											
	10日間目	縮込人数	5名																											
		実施時間	540分																											
		開始	13:30																											
11日間目	終了	22:30																												
	移動等	各60分																												
	縮込人数	5名																												
12日間目	実施時間	540分																												
	開始	20:30																												
	終了	5:30																												
13日間目	移動等	60分																												
	縮込人数	2名																												
	実施時間	540分																												
14日間目	開始	3:30																												
	終了	12:30																												
	移動等	60分																												
15日間目	縮込人数	5名																												
	実施時間	540分																												
	開始	3:30																												
16日間目	終了	12:30																												
	移動等	60分																												
	縮込人数	5名																												

作業内容			所要時間	時刻																											
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3				
タイムテーブル（最終日）				深夜																											
規制時間																															
拘束時間																															
準備（規制村の読み込み等）			60分																												
規制材搬去	基地から規制箇所までの移動		30分																												
	規制材設置		60分																												
	標識		(25分)																												
	テープカー		(20分)																												
	ラバコン		(15分)																												
規制保守時間																															
工事稼働時																															
工事不稼働時																															
規制材搬去	規制撤去前の点検等		30分																												
	規制材撤去		60分																												
	標識		(25分)																												
	テープカー		(20分)																												
	ラバコン		(15分)																												
規制箇所から基地までの移動			30分																												
後片付け			30分																												
労働編成	10班目	実働時間	5:40分																												
		開始	20:30																												
		終了	5:30																												
	11班目	移動等	60分																												
		編成人数	2名																												
		実働時間	5:40分																												
	12班目	開始	3:30																												
		終了	12:30																												
		移動等	各60分																												
	13班目	編成人数	5名																												
実働時間		4:20分																													
開始		10:30																													
14班目	終了	17:30																													
	移動等	60分																													
	編成人数	5名																													

	東北自動車道 R9青森管内舗装補修工事		
図面の種類	交通規制工タイムテーブル（3）		
縮 尺	一	図面番号	
設計会社名			
施工会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社 東北支社 青森管理事務所		

交通規制工タイムテーブル(4)
交通規制工 連続車線規制D2(東北道)

初日開始時刻 6:00
最終日終了時刻 13:30

			時刻																								
作業内容		所要時間	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	深夜の時間帯 (22時～5時)				
タイムテーブル (設備日)																											
開始時間																											
作業時間																											
準備 (搬卸材の積み込み等)			60 分																								
機 材 搬 入	基地から規制箇所までの移動	30 分																									
	規制材設置	60 分																									
	標識	(25 分)																									
	テーパー	(20 分)																									
機 材 搬 出	ラバコン	(15 分)																									
	規制箇所から基地までの移動 後片付け	30 分 30 分																									
工事準備時間																											
工事不稼働時間																											
機 材 搬 入	規制箇所直前の点検等	30 分																									
	規制材搬去	60 分																									
	標識	(25 分)																									
	テーパー	(20 分)																									
機 材 搬 出	ラバコン	(15 分)																									
	規制箇所から基地までの移動 後片付け	30 分 30 分																									
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9															
牙 酸 調 成	1 時 間 目	実験時間	540 分																								
		開始	5:30																								
		終了	14:30																								
	2 時 間 目	移動等	60 分																								
		参加人数	5名																								
		実験時間	540 分																								
	3 時 間 目	開始	12:30																								
		終了	21:30																								
		移動等	各60 分																								
	4 時 間 目	参加人数	5名																								
		実験時間	540 分																								
		開始	19:30																								
5 時 間 目	終了	4:30																									
	移動等	各60 分																									
	参加人数	2名																									
6 時 間 目	実験時間	540 分																									
	開始	2:30																									
	終了	11:30																									
7 時 間 目	移動等	60 分																									
	参加人数	5名																									

[illegible]

	東北自動車道 R 9 青森管内舗装補修工事	
図面の種類	交通規制タイムテーブル（４）	
縮 尺	—	図面番号
設計会社名		
施工会社名		
事務所名	東日本高速道路株式会社 東北支社 青森管理事務所	

交通規制工タイムテーブル(5)
交通規制工 連続車線規制E9(東北道)

[illegible]

作業内容			作業時間	時刻																											
タイムテーブル（中目目）			深夜	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3				
撮影時間																															
作業時間																															
準備（機材の持ち込み等）			60 分																												
機材から現場事務所までの移動			30 分																												
制景材設置			60 分																												
材搬入			搬入（25 分）																												
材搬出			搬出（20 分）																												
撤去			撤去（15 分）																												
撮影（保守時間）			工事準備時間																												
			工事準備時間																												
機材搬出前の点検等			30 分																												
機材搬出前			60 分																												
制景材搬入			搬入（25 分）																												
材搬入			搬入（20 分）																												
材搬出			搬出（15 分）																												
機材搬出から基地までの移動			30 分																												
機材搬出			機材搬出（30 分）																												
			9																												
3 時			開始 19:30																												
終了 4:30																															
移動等			60 分																												
搬入人数 2名				2	3	4	5	6	7	8	9																				
搬出時間			540 分																												
4 時			開始 2:30																												
終了 11:30																															
移動等			60 分																												
搬入人数 5名																															
搬出時間			540 分																												
5 時			開始 9:30																												
終了 18:30																															
移動等			各60 分																												
搬入人数 5名																															
搬出時間			540 分																												
6 時			開始 16:30																												
終了 1:30																															
移動等			各60 分																												
搬入人数 5名																															
搬出時間			540 分																												
7 時			開始 23:30																												
終了 8:30																															
移動等			60 分																												
搬入人数 2名																															

作業内容 タイムテーブル（中見目）		所要時間	時刻																											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3				
深度			深さの時間軸（22時～5時）																											
発射時間																														
拘束時間																														
準備（機材材の読み込み等）			60 分																											
機 材 搬 入	基地から機材置所までの移動		30 分																											
	機材材設置		60 分																											
	機材		(25 分)																											
	テープ		(20 分)																											
	ラバコン		(15 分)																											
機材保守時間			工事不要時																											
			工事不要時																											
機 材 搬 去	機材搬去前の点検等		30 分																											
	機材材搬去		60 分																											
	機材		(25 分)																											
	テープ		(20 分)																											
	ラバコン		(15 分)																											
	機材置所から基地までの移動		30 分																											
後片付け			30 分																											
			5	6	7	8	9																							
分 隔 補 正	実働時間		540 分																											
	7 時 目	開始	23:30																											
		終了	8:30																											
	移動等		60 分																											
	搬入人数		2名																											
	実働時間		540 分																											
	8 時 目	開始	6:30																											
		終了	15:30																											
	移動等		各60 分																											
	搬入人数		5名																											
	実働時間		540 分																											
	9 時 目	開始	13:30																											
		終了	22:30																											
	移動等		各60 分																											
	搬入人数		5名																											
	実働時間		540 分																											
	1 0 時 目	開始	20:30																											
		終了	5:30																											
移動等		60 分																												
搬入人数		2名																												
実働時間		540 分																												
1 1 時 目	開始	3:30																												
	終了	12:30																												
移動等		60 分																												
搬入人数		5名																												

作業内容			時刻																												
作業時間			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3					
タイムテーブル（中継日）			深度の持続等（22時～5時）																												
撮影開始																															
作業終了																															
準備（機材の搬送等）			60分																												
現場から観測箇所までの移動			30分																												
割機材設置			60分																												
材探選			(25分)																												
置テーパ			(20分)																												
置ラバコン			(15分)																												
観測保守時間			工事稼働時																												
			工事不稼働時																												
観測 材 搬 去	観測機主節の点検等			30分																											
	観測機搬去			60分																											
	材探選			(25分)																											
	テーパ			(20分)																											
	ラバコン			(15分)																											
	観測箇所から基地までの移動			30分																											
	後片付け			30分																											
1 0 時 目	定機時間			540分	8	9																									
	開始			20:30																											
	終了			5:30																											
	移動等			60分																											
	観測人数			2名	1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
	定機時間			540分																											
	開始			3:30																											
	終了			12:30																											
	移動等			60分																											
	観測人数			5名																											
1 1 時 目	定機時間			540分																											
	開始			10:30																											
	終了			19:30																											
	移動等			60分																											
	観測人数			5名																											
	定機時間			540分																											
	開始			17:30																											
	終了			2:30																											
	移動等			60分																											
	観測人数			2名																											
1 2 時 目	定機時間			540分																											
	開始			0:30																											
	終了			9:30																											
	移動等			60分																											
	観測人数			5名																											
	定機時間			540分																											
	開始			17:30																											
	終了			2:30																											
	移動等			60分																											
	観測人数			2名																											
1 3 時 目	定機時間			540分																											
	開始			0:30																											
	終了			9:30																											
	移動等			60分																											
	観測人数			5名																											
	定機時間			540分																											
	開始			17:30																											
	終了			2:30																											
	移動等			60分																											
	観測人数			2名																											
1 4 時 目	定機時間			540分																											
	開始			0:30																											
	終了			9:30																											
	移動等			60分																											
	観測人数			5名																											
	定機時間			540分																											
	開始			17:30																											
	終了			2:30																											
	移動等			60分																											
	観測人数			2名																											

	東北自動車道		
	R9 青森管内舗装補修工事		
図面の種類	交通規制エタイムテーブル（5）		
縮 尺	一	図面番号	
設計会社名			
施工会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社 東北支社 青森管理事務所		

交通規制工タイムテーブル(6)
交通規制工 連続車線規制E9(東北道)

作業内容		所要時間	時刻																													
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3						
タイムテーブル（中間日）			深夜																													
規制時間																																
拘束時間																																
準備（規制材の積み込み等）		60分																														
規		30分																														
制		60分																														
材		搬運（25分）																														
設		テーパー（20分）																														
置		ラバコン（15分）																														
規制保守時間		工事稼働時 工事不稼働時																														
規制撤去前の点検等		30分																														
規制材撤去		60分																														
搬運		（25分）																														
テーパー		（20分）																														
ラバコン		（15分）																														
規制箇所から基地までの移動		30分																														
後片付け		30分																														
			4	5	6	7	8	9																								
労働編成	1 4 班 目	実施時間	540分																													
		開始	0:30																													
		終了	9:30																													
		移動等	60分																													
	編成人数	5名	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
	1 5 班 目	実施時間	540分																													
		開始	7:30																													
		終了	16:30																													
		移動等	各60分																													
	編成人数	5名												0	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
1 6 班 目	実施時間	540分																														
	開始	14:30																														
	終了	23:30																														
	移動等	各60分																														
編成人数	5名																									0	1	2	3	4	5	6
1 7 班 目	実施時間	540分																														
	開始	21:30																														
	終了	6:30																														
	移動等	60分																														
編成人数	2名																															

[illegible]

作業内容 タイムテーブル（中間日）		所要時間	時刻																												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3					
深夜			深夜の時間帯（22時～5時）																												
規制時間																															
拘束時間																															
準備（規制材の積込み等）			60分																												
規制材搬入	基地から規制箇所までの移動		30分																												
	規制材設置		60分																												
	標識		(25分)																												
	テーパー		(20分)																												
	ラバコン		(15分)																												
規制保守時間			工事稼働時 工事不稼働時																												
規制材撤去	規制撤去前の点検等		30分																												
	規制材撤去		60分																												
	標識		(25分)																												
	テーパー		(20分)																												
	ラバコン		(15分)																												
	規制箇所から基地までの移動 後片付け		30分 30分																												
歩道橋完成	17項目		7	8	9																										
	実施時間		540分																												
	開始		21:30																												
	終了		6:30																												
	移動等		60分																												
	編成人数		2名	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
	18項目		8																												
	実施時間		540分																												
	開始		4:30																												
	終了		13:30																												
移動等		各60分																													
編成人数		2名																													
19項目		9																													
実施時間		540分																													
開始		11:30																													
終了		20:30																													
移動等		各60分																													
編成人数		2名																													
20項目		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
実施時間		540分																													
開始		18:30																													
終了		3:30																													
移動等		各60分																													
編成人数		2名																													
21項目		1																													
実施時間		540分																													
開始		1:30																													
終了		10:30																													
移動等		60分																													
編成人数		2名																													

作業内容		所要時間	時刻																												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3					
タイムテーブル（中間日）			深夜	深夜の時間帯（22時～5時）																											
規制時間																															
拘束時間																															
準備（規制材の横込み等）			60分																												
規制材搬去	基地から規制箇所までの移動	30分																													
	規制材設置	60分																													
	標識（25分）	(25分)																													
	テープ	(20分)																													
	ラバコン	(15分)																													
規制保守時間																															
工事稼働時																															
工事不稼働時																															
規制撤去前の点検等			30分																												
規制材搬去	規制材搬去	60分																													
	標識	(25分)																													
	テープ	(20分)																													
	ラバコン	(15分)																													
	規制箇所から基地までの移動	30分																													
後片付け			30分																												
			6	7	8	9																									
2 4 項目	実施時間	540分																													
	開始	22:30																													
	終了	7:30																													
	移動等	60分																													
	編成人数	2名	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																			
2 5 項目	実施時間	540分																													
	開始	5:30																													
	終了	14:30																													
	移動等	各60分																													
	編成人数	5名																													
2 6 項目	実施時間	540分																													
	開始	12:30																													
	終了	21:30																													
	移動等	各60分																													
	編成人数	5名																													
2 7 項目	実施時間	540分																													
	開始	19:30																													
	終了	4:30																													
	移動等	各60分																													
	編成人数	2名																													
2 8 項目	実施時間	540分																													
	開始	2:30																													
	終了	11:30																													
	移動等	60分																													
	編成人数	5名																													

	東北自動車道 R9青森管内舗装補修工事	
図面の種類	交通規制タイムテーブル（6）	
縮 尺	—	図面番号
設計会社名		
施工会社名		
事務所名	東日本高速道路株式会社 東北支社 青森管理事務所	

交通規制エタイムテーブル(7)
交通規制工 連続車線規制E9(東北道)

			時刻																											
作業内容		所要時間	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3				
タイムテーブル（最終日）			深夜																		深夜の時間帯（22時～5時）									
規制時間																														
拘束時間																														
準備（規制材の積み込み等）			60 分																											
規制材設置	基地から規制箇所までの移動		30 分																											
	規制材設置		60 分																											
	標識		(25 分)																											
	テーパー		(20 分)																											
	ラバコン		(15 分)																											
規制保守時間		工事稼働時																												
		工事不稼働時																												
規制材撤去	規制撤去前の点検等		30 分																											
	規制材撤去		60 分																											
	標識		(25 分)																											
	テーパー		(20 分)																											
	ラバコン		(15 分)																											
	規制箇所から基地までの移動		30 分																											
	後片付け		30 分																											
労務編成			9																											
	27班目	実働時間	540 分																											
		開始	19:30																											
		終了	4:30																											
		移動等	60 分																											
	編成人数		2名	2	3	4	5	6	7	8	9																			
	28班目	実働時間	540 分																											
		開始	2:30																											
		終了	11:30																											
		移動等	60 分																											
	編成人数		5名																											
	29班目	実働時間	210 分																											
		開始	9:30																											
		終了	13:00																											
		移動等	60 分																											
編成人数		5名																												

交通規制工タイムテーブル(8)
交通規制工 通行止規制A(青森道)(Y)

規制保守 開始 19:30
終了 5:00 規制の保守時間：9.50時間

			時刻																												
作業内容			所要時間	17		18		19		20		21		22		23		0		1		2		3		4		5		6	
規制時間																															
拘束時間																															
クリア																															
準備（規制材の積み込み等）			60 分																												
規制材設置	基地から規制箇所までの移動		30 分																												
	規制材設置		30 分																												
	標識																														
	テーパー																														
	ラバコン																														
規制保守時間																															
規制材撤去	規制撤去前の点検等																														
	規制材撤去		30 分																												
	標識																														
	テーパー																														
	ラバコン																														
	規制箇所から基地までの移動		30 分																												
後片付け			30 分																												
労務編成	1 班 目	実働時間		540 分																											
		開始	17:30																												
		終了	2:30																												
		移動等		60 分																											
	2 班 目	実働時間		390 分																											
		開始	0:30																												
		終了	7:00																												
		移動等		60 分																											

東北自動車道 R9 青森管内舗装補修工事			
図面の種類	交通規制工タイムテーブル（8）		
縮 尺	—	図面番号	
設計会社名			
施工会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社 東北支社 青森管理事務所		

交通規制エタイムテーブル(9)
交通規制工 通行止規制B(青森道)(Y)

規制保守 開始 19:30
終了 5:00 規制の保守時間：9.50時間

作業内容		所要時間	時刻																							
			17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6										
規制時間																										
拘束時間																										
クリア																										
準備（規制材の積み込み等）		60 分																								
規制材設置	基地から規制箇所までの移動	30 分																								
	規制材設置	30 分																								
	標識																									
	テーパー																									
	ラバコン																									
規制保守時間																										
規制材撤去	規制撤去前の点検等																									
	規制材撤去	30 分																								
	標識																									
	テーパー																									
	ラバコン																									
	規制箇所から基地までの移動	30 分																								
後片付け		30 分																								
労務編成	1 班 目	実働時間	540 分																							
		開始 17:30																								
		終了 2:30																								
		移動等	60 分																							
	2 班 目	実働時間	390 分																							
		開始 0:30																								
		終了 7:00																								
		移動等	60 分																							

東北自動車道 R9 青森管内舗装補修工事			
図面の種類	交通規制エタイムテーブル（9）		
縮 尺	—	図面番号	
設計会社名			
施工会社名			
事務所名	東日本高速道路株式会社 東北支社 青森管理事務所		
