

上信越自動車道

佐久管内休憩施設舗装改良工事

交 付 図 書 正 誤 表

東日本高速道路株式会社 関東支社

佐 久 管 理 事 務 所

工事名) 上信越自動車道 佐久管内休憩施設舗装改良工事

正誤表(1/3)

番号	対象	誤	正	備考
1	特記仕様書	特記仕様書 13. 残存物件の処理に関する事項 13-1 発生する残存物件と引渡し方法 表における品目の記載誤り。	特記仕様書 13. 残存物件の処理に関する事項 13-1 発生する残存物件と引渡し方法 表における品目の記載訂正。	訂正
2	特記仕様書	特記仕様書 16. 再生資源及び建設副産物に関する事項 16-2 (2) 再資源化(最終処分)をする施設の名称及び所在地 表における記載事項の誤り。	特記仕様書 16. 再生資源及び建設副産物に関する事項 16-2 (2) 再資源化(最終処分)をする施設の名称及び所在地 表における記載事項の訂正。	訂正
3	特記仕様書	特記仕様書 21. 工事細部に関する事項 21-26-2 種別 表における区分内容の記載誤り。	特記仕様書 21. 工事細部に関する事項 21-26-2 種別 表における区分内容の記載訂正。	訂正
4	特記仕様書	特記仕様書 21. 工事細部に関する事項 21-16-3 支払 記載内容の誤り。	特記仕様書 21. 工事細部に関する事項 21-16-3 支払 記載内容の訂正。	訂正
5	特記仕様書	特記仕様書 22.割掛対象表の項目に示す工事の内容 【雑工事費】 表における記載内容の誤り。	特記仕様書 22.割掛対象表の項目に示す工事の内容 【雑工事費】 表における記載内容の訂正。	訂正
6	特記仕様書	特記仕様書 21. 工事細部に関する事項 21-28-6 支払 記載内容の誤り。	特記仕様書 21. 工事細部に関する事項 21-28-6 支払 記載内容の訂正。	訂正
7	割掛対象表	割掛対象表 No.3 割掛先契約項目の記載誤り。	割掛対象表 No.3 割掛先契約項目の記載訂正。	訂正
8	設計図	設計図 12/147 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 12/147 設計図の差替え。	訂正
9	設計図	設計図 24/147 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 24/147 設計図の差替え。	訂正
10	設計図	設計図 61/147 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 61/147 設計図の差替え。	訂正
11	設計図	設計図 参1/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参1/参17 設計図の差替え。	訂正
12	設計図	設計図 参2/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参2/参17 設計図の差替え。	訂正
13	設計図	設計図 参3/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参3/参17 設計図の差替え。	訂正

工事名) 上信越自動車道 佐久管内休憩施設舗装改良工事

正誤表(2/3)

番号	対象	誤	正	備考
14	設計図	設計図 参4/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参4/参17 設計図の差替え。	訂正
15	設計図	設計図 参5/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参5/参17 設計図の差替え。	訂正
16	設計図	設計図 参6/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参6/参17 設計図の差替え。	訂正
17	設計図	設計図 参7/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参7/参17 設計図の差替え。	訂正
18	設計図	設計図 参8/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参8/参17 設計図の差替え。	訂正
19	設計図	設計図 参9/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参9/参17 設計図の差替え。	訂正
20	設計図	設計図 参10/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参10/参17 設計図の差替え。	訂正
21	設計図	設計図 参11/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参11/参17 設計図の差替え。	訂正
22	設計図	設計図 参12/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参12/参17 設計図の差替え。	訂正
23	設計図	設計図 参13/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参13/参17 設計図の差替え。	訂正
24	設計図	設計図 参14/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参14/参17 設計図の差替え。	訂正
25	設計図	設計図 参15/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参15/参17 設計図の差替え。	訂正
26	設計図	設計図 参16/参17 設計図解像度による記載文字の潰れ。	設計図 参16/参17 設計図の差替え。	訂正

工事名) 上信越自動車道 佐久管内休憩施設舗装改良工事

正誤表(3/3)

[illegible]

対象 誤	特記仕様書 13. 残存物件の処理に関する事項 13-1 発生する残存物件と引渡し方法 12. 貸与品に関する事項 12-1 貸与品 契約書第15条第1項に基づく貸与品は、下表のとおりとし、設計図書に定められた使用目的以外に資機材を使用してはならない。 <table><tr><th>品名</th><th>規格等</th><th>数量</th><th>引渡場所</th><th>貸与期間</th></tr><tr><td>標識車</td><td>2 t</td><td>2 台</td><td rowspan="3">佐久管理事務所</td><td rowspan="3">工事期間中</td></tr><tr><td>標識</td><td>車載式</td><td>—</td></tr><tr><td>交通規制標識類</td><td>高速道路等の交通規制に必要な数量</td><td>1 式</td></tr></table> 貸与機械の使用は無償とする。なお、機械の運転に要する燃料、油脂、現場修理及び管理に要する費用は、関連する単価表の項目の単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。 13. 残存物件の処理に関する事項 13-1 発生する残存物件と引渡し方法 本工事で発生する残存物件及び引渡し方法等は下表のとおりとする。なお、残存物件を引渡す場合は、残存物件調査（様式-3）を提出するとともに、その数量の確認を受けるものとする。 <table><tr><th>品名</th><th>寸法等</th><th>数量</th><th>単位</th><th>摘要</th></tr><tr><td>標識柱（単柱式）</td><td rowspan="9">設計図面による</td><td>22</td><td>基</td><td rowspan="9">発注者に引き渡し、 ※引き渡し場所（位置） 平尾高架橋高架下資材置場 P14-P15 区間</td></tr><tr><td>標識柱（複柱式）</td><td>7</td><td>基</td></tr><tr><td>標識板（反射式）</td><td>70</td><td>m2</td></tr><tr><td>防護柵（Gr-A-4E）</td><td>7</td><td>m</td></tr><tr><td>防護柵（Gr-B-4E）</td><td>9</td><td>m</td></tr><tr><td>防護柵（Gr-C-4E）</td><td>9</td><td>m</td></tr><tr><td>スロープ手摺</td><td>9</td><td>m</td></tr><tr><td>アーチ型車止め</td><td>47</td><td>基</td></tr><tr><td>メッシュフェンス</td><td>50</td><td>m</td></tr><tr><td>障がい者・二輪車ます上屋</td><td></td><td>1</td><td>箇所</td><td></td></tr></table> なお、これらに要する費用は関連項目の契約単価に含むものとし別途支払いは行わないものとする。 13-2 残存物件の売却処分について 監督員の指示により、本特記仕様書13-1「発生する残存物件と引渡し方法」で示した残存物件について受注者による売却処分を追加する場合がある。この場合は、受注者はその指示に従うものとし、残存物件の売却額については監督員と受注者間で別途協議し定めるものとする。	品名	規格等	数量	引渡場所	貸与期間	標識車	2 t	2 台	佐久管理事務所	工事期間中	標識	車載式	—	交通規制標識類	高速道路等の交通規制に必要な数量	1 式	品名	寸法等	数量	単位	摘要	標識柱（単柱式）	設計図面による	22	基	発注者に引き渡し、 ※引き渡し場所（位置） 平尾高架橋高架下資材置場 P14-P15 区間	標識柱（複柱式）	7	基	標識板（反射式）	70	m2	防護柵（Gr-A-4E）	7	m	防護柵（Gr-B-4E）	9	m	防護柵（Gr-C-4E）	9	m	スロープ手摺	9	m	アーチ型車止め	47	基	メッシュフェンス	50	m	障がい者・二輪車ます上屋		1	箇所				
品名	規格等	数量	引渡場所	貸与期間																																																							
標識車	2 t	2 台	佐久管理事務所	工事期間中																																																							
標識	車載式	—																																																									
交通規制標識類	高速道路等の交通規制に必要な数量	1 式																																																									
品名	寸法等	数量	単位	摘要																																																							
標識柱（単柱式）	設計図面による	22	基	発注者に引き渡し、 ※引き渡し場所（位置） 平尾高架橋高架下資材置場 P14-P15 区間																																																							
標識柱（複柱式）		7	基																																																								
標識板（反射式）		70	m2																																																								
防護柵（Gr-A-4E）		7	m																																																								
防護柵（Gr-B-4E）		9	m																																																								
防護柵（Gr-C-4E）		9	m																																																								
スロープ手摺		9	m																																																								
アーチ型車止め		47	基																																																								
メッシュフェンス		50	m																																																								
障がい者・二輪車ます上屋		1	箇所																																																								
正	12. 貸与品に関する事項 12-1 貸与品 契約書第15条第1項に基づく貸与品は、下表のとおりとし、設計図書に定められた使用目的以外に資機材を使用してはならない。 <table><tr><th>品名</th><th>規格等</th><th>数量</th><th>引渡場所</th><th>貸与期間</th></tr><tr><td>標識車</td><td>2 t</td><td>2 台</td><td rowspan="3">佐久管理事務所</td><td rowspan="3">工事期間中</td></tr><tr><td>標識</td><td>車載式</td><td>—</td></tr><tr><td>交通規制標識類</td><td>高速道路等の交通規制に必要な数量</td><td>1 式</td></tr></table> 貸与機械の使用は無償とする。なお、機械の運転に要する燃料、油脂、現場修理及び管理に要する費用は、関連する単価表の項目の単価に含むものとし、別途支払は行わないものとする。 13. 残存物件の処理に関する事項 13-1 発生する残存物件と引渡し方法 本工事で発生する残存物件及び引渡し方法等は下表のとおりとする。なお、残存物件を引渡す場合は、残存物件調査（様式-3）を提出するとともに、その数量の確認を受けるものとする。 <table><tr><th>品名</th><th>寸法等</th><th>数量</th><th>単位</th><th>摘要</th></tr><tr><td>標識柱（単柱式）</td><td rowspan="9">設計図面による</td><td>22</td><td>基</td><td rowspan="9">発注者に引き渡し、 ※引き渡し場所（位置） 平尾高架橋高架下資材置場 P14-P15 区間</td></tr><tr><td>標識柱（複柱式）</td><td>7</td><td>基</td></tr><tr><td>標識板（反射式）</td><td>70</td><td>m2</td></tr><tr><td>防護柵（Gr-A-4E）</td><td>7</td><td>m</td></tr><tr><td>防護柵（Gr-B-4E）</td><td>9</td><td>m</td></tr><tr><td>防護柵（Gr-C-4E）</td><td>9</td><td>m</td></tr><tr><td>ラバーポール</td><td>153</td><td>基</td></tr><tr><td>スロープ手摺</td><td>9</td><td>m</td></tr><tr><td>アーチ型車止め</td><td>47</td><td>基</td></tr><tr><td>メッシュフェンス</td><td>50</td><td>m</td></tr><tr><td>障がい者・二輪車ます上屋</td><td></td><td>1</td><td>箇所</td><td></td></tr></table> なお、これらに要する費用は関連項目の契約単価に含むものとし別途支払いは行わないものとする。 13-2 残存物件の売却処分について 監督員の指示により、本特記仕様書13-1「発生する残存物件と引渡し方法」で示した残存物件について受注者による売却処分を追加する場合がある。この場合は、受注者はその指示に従うものとし、残存物件の売却額については監督員と受注者間で別途協議し定めるものとする。	品名	規格等	数量	引渡場所	貸与期間	標識車	2 t	2 台	佐久管理事務所	工事期間中	標識	車載式	—	交通規制標識類	高速道路等の交通規制に必要な数量	1 式	品名	寸法等	数量	単位	摘要	標識柱（単柱式）	設計図面による	22	基	発注者に引き渡し、 ※引き渡し場所（位置） 平尾高架橋高架下資材置場 P14-P15 区間	標識柱（複柱式）	7	基	標識板（反射式）	70	m2	防護柵（Gr-A-4E）	7	m	防護柵（Gr-B-4E）	9	m	防護柵（Gr-C-4E）	9	m	ラバーポール	153	基	スロープ手摺	9	m	アーチ型車止め	47	基	メッシュフェンス	50	m	障がい者・二輪車ます上屋		1	箇所	
品名	規格等	数量	引渡場所	貸与期間																																																							
標識車	2 t	2 台	佐久管理事務所	工事期間中																																																							
標識	車載式	—																																																									
交通規制標識類	高速道路等の交通規制に必要な数量	1 式																																																									
品名	寸法等	数量	単位	摘要																																																							
標識柱（単柱式）	設計図面による	22	基	発注者に引き渡し、 ※引き渡し場所（位置） 平尾高架橋高架下資材置場 P14-P15 区間																																																							
標識柱（複柱式）		7	基																																																								
標識板（反射式）		70	m2																																																								
防護柵（Gr-A-4E）		7	m																																																								
防護柵（Gr-B-4E）		9	m																																																								
防護柵（Gr-C-4E）		9	m																																																								
ラバーポール		153	基																																																								
スロープ手摺		9	m																																																								
アーチ型車止め		47	基																																																								
メッシュフェンス	50	m																																																									
障がい者・二輪車ます上屋		1	箇所																																																								
備考	「ラバーポール 153基」の追加																																																										

対象	特記仕様書 16. 再生資源及び建設副産物に関する事項 16-2 (2) 再資源化（最終処分）をする施設の名称及び所在地																																							
誤	(2)再資源化（最終処分）をする施設の名称及び所在地 <table><thead><tr><th>特定建設資材 廃棄物の種類</th><th>施設の名称</th><th>所 在 地</th><th>受 入 条 件</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">アスファルト・ コンクリート塊</td><td>㈱エコ・プロセ ス</td><td>安中市 中野谷字大 下原 3617-1</td><td>定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限100×100×10cm以下</td></tr><tr><td>(有)山浦建材</td><td>小諸市大字 平原字星合 1320-2</td><td>定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限40×40×40cm以下</td></tr><tr><td>㈱塩沢産業 東部工場</td><td>東御市 大字加沢 201-1</td><td>定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下</td></tr><tr><td>㈱塩沢産業 上田工場</td><td>上田市下之 条1740</td><td>定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下</td></tr><tr><td>㈱イワバナ</td><td>埴科郡 坂城町 大字上平 2291-98</td><td>定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限50×50×50cm以下</td></tr><tr><td rowspan="4">コンクリート塊 （無筋） （有筋）</td><td>岩井建設㈱</td><td>下仁田町馬 山5455</td><td>定休日曜日、祝祭日、土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限50×50×30cm以下</td></tr><tr><td>㈱山浦建材</td><td>小諸市平原 字星合 1320-2</td><td>定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限40×40×40cm以下</td></tr><tr><td>㈱塩沢産業 東部工場</td><td>東御市大字 加沢201-1</td><td>定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下</td></tr><tr><td>㈱イワバナ</td><td>埴科郡 坂城町 大字上平 2291-98</td><td>定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要相談） 廃材大きき制限50×50×50cm以下</td></tr></tbody></table> 削除				特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所 在 地	受 入 条 件	アスファルト・ コンクリート塊	㈱エコ・プロセ ス	安中市 中野谷字大 下原 3617-1	定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限100×100×10cm以下	(有)山浦建材	小諸市大字 平原字星合 1320-2	定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限40×40×40cm以下	㈱塩沢産業 東部工場	東御市 大字加沢 201-1	定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下	㈱塩沢産業 上田工場	上田市下之 条1740	定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下	㈱イワバナ	埴科郡 坂城町 大字上平 2291-98	定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限50×50×50cm以下	コンクリート塊 （無筋） （有筋）	岩井建設㈱	下仁田町馬 山5455	定休日曜日、祝祭日、土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限50×50×30cm以下	㈱山浦建材	小諸市平原 字星合 1320-2	定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限40×40×40cm以下	㈱塩沢産業 東部工場	東御市大字 加沢201-1	定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下	㈱イワバナ	埴科郡 坂城町 大字上平 2291-98	定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要相談） 廃材大きき制限50×50×50cm以下			
特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所 在 地	受 入 条 件																																					
アスファルト・ コンクリート塊	㈱エコ・プロセ ス	安中市 中野谷字大 下原 3617-1	定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限100×100×10cm以下																																					
	(有)山浦建材	小諸市大字 平原字星合 1320-2	定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限40×40×40cm以下																																					
	㈱塩沢産業 東部工場	東御市 大字加沢 201-1	定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下																																					
	㈱塩沢産業 上田工場	上田市下之 条1740	定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下																																					
	㈱イワバナ	埴科郡 坂城町 大字上平 2291-98	定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限50×50×50cm以下																																					
コンクリート塊 （無筋） （有筋）	岩井建設㈱	下仁田町馬 山5455	定休日曜日、祝祭日、土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限50×50×30cm以下																																					
	㈱山浦建材	小諸市平原 字星合 1320-2	定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限40×40×40cm以下																																					
	㈱塩沢産業 東部工場	東御市大字 加沢201-1	定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下																																					
	㈱イワバナ	埴科郡 坂城町 大字上平 2291-98	定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要相談） 廃材大きき制限50×50×50cm以下																																					
	19																																							
正	(2)再資源化（最終処分）をする施設の名称及び所在地 <table><thead><tr><th>特定建設資材 廃棄物の種類</th><th>施設の名称</th><th>所 在 地</th><th>受 入 条 件</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="6">アスファルト・ コンクリート塊</td><td>㈱BEL TRUST</td><td>安中市松井 田町入山霞 沢274</td><td>定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入不可</td></tr><tr><td>㈱山浦建材</td><td>小諸市大字 平原字星合 1320-2</td><td>定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限40×40×40cm以下</td></tr><tr><td>高沢産業㈱ 東部工場</td><td>東御市大字 加沢東原 1362-1</td><td>定休日曜日、祝祭日、土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下</td></tr><tr><td>㈱佐藤商会 生田営業所</td><td>上田市生田 字神田 1413-2</td><td>定休日曜日、会社指定日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入不可</td></tr><tr><td>㈱塩沢産業 上田工場</td><td>上田市下之 条1740</td><td>定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下</td></tr><tr><td>㈱イワバナ</td><td>埴科郡 坂城町 大字上平 2291-98</td><td>定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限50×50×50cm以下</td></tr><tr><td rowspan="4">コンクリート塊 （無筋） （有筋）</td><td>㈱山浦土木</td><td>佐久市小田 井字唄坂 1261-1</td><td>定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限50×50×50cm以下</td></tr><tr><td>㈱山浦建材</td><td>小諸市平原 字星合132 0-2</td><td>定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限40×40×40cm以下</td></tr><tr><td>㈱塩沢産業 東部工場</td><td>東御市大字 加沢201-1</td><td>定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下</td></tr><tr><td>㈱佐藤商会 生田営業所</td><td>上田市生田 字神田 1413-2</td><td>定休日曜日、会社指定日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入不可</td></tr></tbody></table> 追加				特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所 在 地	受 入 条 件	アスファルト・ コンクリート塊	㈱BEL TRUST	安中市松井 田町入山霞 沢274	定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入不可	㈱山浦建材	小諸市大字 平原字星合 1320-2	定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限40×40×40cm以下	高沢産業㈱ 東部工場	東御市大字 加沢東原 1362-1	定休日曜日、祝祭日、土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下	㈱佐藤商会 生田営業所	上田市生田 字神田 1413-2	定休日曜日、会社指定日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入不可	㈱塩沢産業 上田工場	上田市下之 条1740	定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下	㈱イワバナ	埴科郡 坂城町 大字上平 2291-98	定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限50×50×50cm以下	コンクリート塊 （無筋） （有筋）	㈱山浦土木	佐久市小田 井字唄坂 1261-1	定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限50×50×50cm以下	㈱山浦建材	小諸市平原 字星合132 0-2	定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限40×40×40cm以下	㈱塩沢産業 東部工場	東御市大字 加沢201-1	定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下	㈱佐藤商会 生田営業所	上田市生田 字神田 1413-2	定休日曜日、会社指定日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入不可
特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所 在 地	受 入 条 件																																					
アスファルト・ コンクリート塊	㈱BEL TRUST	安中市松井 田町入山霞 沢274	定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入不可																																					
	㈱山浦建材	小諸市大字 平原字星合 1320-2	定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限40×40×40cm以下																																					
	高沢産業㈱ 東部工場	東御市大字 加沢東原 1362-1	定休日曜日、祝祭日、土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下																																					
	㈱佐藤商会 生田営業所	上田市生田 字神田 1413-2	定休日曜日、会社指定日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入不可																																					
	㈱塩沢産業 上田工場	上田市下之 条1740	定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下																																					
	㈱イワバナ	埴科郡 坂城町 大字上平 2291-98	定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限50×50×50cm以下																																					
コンクリート塊 （無筋） （有筋）	㈱山浦土木	佐久市小田 井字唄坂 1261-1	定休日曜日、祝祭日、第2、4土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限50×50×50cm以下																																					
	㈱山浦建材	小諸市平原 字星合132 0-2	定休日曜日、祝祭日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限40×40×40cm以下																																					
	㈱塩沢産業 東部工場	東御市大字 加沢201-1	定休日曜日、祝祭日、第2、4、5土曜日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入可（要事前連絡） 廃材大きき制限30×30×30cm以下																																					
	㈱佐藤商会 生田営業所	上田市生田 字神田 1413-2	定休日曜日、会社指定日 受入時間帯8:00～17:00 定時外受入不可																																					
	19																																							
備考	「施設の名称、所在地、受入条件」の変更																																							

対象 誤	特記仕様書 21. 工事細部に関する事項 21-26-2 種別															
	21-25-3 施工 標識撤去移設工の施工にあたっては既設の標識柱又は標識板を損傷させないよう丁寧に撤去するものとする。															
	21-25-4 数量の検測 標識撤去移設工の数量の検測は、設計数量（基）又は（m2）で行うものとする。															
	21-25-5 支払 標識撤去移設工の支払いは、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ1基又は1m2当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設の標識柱又は標識板の撤去、運搬、再設置等標識撤去移設工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。															
	<table><tr><td></td><td>単価表の項目</td><td>検測の単位</td></tr><tr><td>特一（7）</td><td>標識撤去移設工</td><td></td></tr><tr><td></td><td>標識柱 A</td><td>基</td></tr><tr><td></td><td>標識板</td><td>m2</td></tr></table>		単価表の項目	検測の単位	特一（7）	標識撤去移設工			標識柱 A	基		標識板	m2			
		単価表の項目	検測の単位													
	特一（7）	標識撤去移設工														
		標識柱 A	基													
		標識板	m2													
	21-26 撤去工 21-26-1 定義 撤去工とは、設計図面及び監督員の指示に従い、既設構造物を撤去し資材置き場へ搬入又は処分することをいう。															
21-26-2 種別 撤去工の単価表の項目の種別は次のとおりとする。																
<table><tr><th>単価表の種別</th><th>区分内容</th><th>摘要</th></tr><tr><td>撤去工 A</td><td>東部湯の丸SA（上下線）既設防護柵Gr-A-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。</td><td rowspan="6">平尾高架橋高架下資材置場 P14-P15 径間</td></tr><tr><td>撤去工 B</td><td>佐久平スマートIC既設防護柵Gr-B-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。</td></tr><tr><td>撤去工 C</td><td>佐久平スマートIC既設防護柵Gr-C-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。</td></tr><tr><td>撤去工 D</td><td>東部湯の丸SA（上下線）既設ラバーボールを撤去し、処分するもの。</td></tr><tr><td>撤去工 E</td><td>東部湯の丸SA（上り線）既設スロープ手摺を撤去し、資材置場へ運搬するもの。</td></tr><tr><td>撤去工 F（T）</td><td>東部湯の丸SA（下り線）既設アーチ型車止めを撤去し、資材置場へ運搬するもの。</td></tr></table>	単価表の種別	区分内容	摘要	撤去工 A	東部湯の丸SA（上下線）既設防護柵Gr-A-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。	平尾高架橋高架下資材置場 P14-P15 径間	撤去工 B	佐久平スマートIC既設防護柵Gr-B-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。	撤去工 C	佐久平スマートIC既設防護柵Gr-C-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。	撤去工 D	東部湯の丸SA（上下線）既設ラバーボールを撤去し、処分するもの。	撤去工 E	東部湯の丸SA（上り線）既設スロープ手摺を撤去し、資材置場へ運搬するもの。	撤去工 F（T）	東部湯の丸SA（下り線）既設アーチ型車止めを撤去し、資材置場へ運搬するもの。
単価表の種別	区分内容	摘要														
撤去工 A	東部湯の丸SA（上下線）既設防護柵Gr-A-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。	平尾高架橋高架下資材置場 P14-P15 径間														
撤去工 B	佐久平スマートIC既設防護柵Gr-B-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。															
撤去工 C	佐久平スマートIC既設防護柵Gr-C-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。															
撤去工 D	東部湯の丸SA（上下線）既設ラバーボールを撤去し、処分するもの。															
撤去工 E	東部湯の丸SA（上り線）既設スロープ手摺を撤去し、資材置場へ運搬するもの。															
撤去工 F（T）	東部湯の丸SA（下り線）既設アーチ型車止めを撤去し、資材置場へ運搬するもの。															
51																
正	21-25-3 施工 標識撤去移設工の施工にあたっては既設の標識柱又は標識板を損傷させないよう丁寧に撤去するものとする。															
	21-25-4 数量の検測 標識撤去移設工の数量の検測は、設計数量（基）又は（m2）で行うものとする。															
	21-25-5 支払 標識撤去移設工の支払いは、前項の規定に従って検測された数量に対し、それぞれ1基又は1m2当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設の標識柱又は標識板の撤去、運搬、再設置等標識撤去移設工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。															
	<table><tr><td></td><td>単価表の項目</td><td>検測の単位</td></tr><tr><td>特一（7）</td><td>標識撤去移設工</td><td></td></tr><tr><td></td><td>標識柱 A</td><td>基</td></tr><tr><td></td><td>標識板</td><td>m2</td></tr></table>		単価表の項目	検測の単位	特一（7）	標識撤去移設工			標識柱 A	基		標識板	m2			
		単価表の項目	検測の単位													
	特一（7）	標識撤去移設工														
		標識柱 A	基													
		標識板	m2													
	21-26 撤去工 21-26-1 定義 撤去工とは、設計図面及び監督員の指示に従い、既設構造物を撤去し資材置き場へ搬入又は処分することをいう。															
	21-26-2 種別 撤去工の単価表の項目の種別は次のとおりとする。															
<table><tr><th>単価表の種別</th><th>区分内容</th><th>摘要</th></tr><tr><td>撤去工 A</td><td>東部湯の丸SA（上下線）既設防護柵Gr-A-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。</td><td rowspan="6">平尾高架橋高架下資材置場 P14-P15 径間</td></tr><tr><td>撤去工 B</td><td>佐久平スマートIC既設防護柵Gr-B-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。</td></tr><tr><td>撤去工 C</td><td>佐久平スマートIC既設防護柵Gr-C-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。</td></tr><tr><td>撤去工 D</td><td>東部湯の丸SA（上下線）既設ラバーボールを撤去し、資材置場へ運搬するもの。</td></tr><tr><td>撤去工 E</td><td>東部湯の丸SA（上り線）既設スロープ手摺を撤去し、資材置場へ運搬するもの。</td></tr><tr><td>撤去工 F（T）</td><td>東部湯の丸SA（下り線）既設アーチ型車止めを撤去し、資材置場へ運搬するもの。</td></tr></table>	単価表の種別	区分内容	摘要	撤去工 A	東部湯の丸SA（上下線）既設防護柵Gr-A-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。	平尾高架橋高架下資材置場 P14-P15 径間	撤去工 B	佐久平スマートIC既設防護柵Gr-B-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。	撤去工 C	佐久平スマートIC既設防護柵Gr-C-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。	撤去工 D	東部湯の丸SA（上下線）既設ラバーボールを撤去し、資材置場へ運搬するもの。	撤去工 E	東部湯の丸SA（上り線）既設スロープ手摺を撤去し、資材置場へ運搬するもの。	撤去工 F（T）	東部湯の丸SA（下り線）既設アーチ型車止めを撤去し、資材置場へ運搬するもの。
単価表の種別	区分内容	摘要														
撤去工 A	東部湯の丸SA（上下線）既設防護柵Gr-A-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。	平尾高架橋高架下資材置場 P14-P15 径間														
撤去工 B	佐久平スマートIC既設防護柵Gr-B-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。															
撤去工 C	佐久平スマートIC既設防護柵Gr-C-4Eを撤去し、資材置場へ運搬するもの。															
撤去工 D	東部湯の丸SA（上下線）既設ラバーボールを撤去し、資材置場へ運搬するもの。															
撤去工 E	東部湯の丸SA（上り線）既設スロープ手摺を撤去し、資材置場へ運搬するもの。															
撤去工 F（T）	東部湯の丸SA（下り線）既設アーチ型車止めを撤去し、資材置場へ運搬するもの。															
51																
備考	「区分内容」の変更															

対象

誤

特記仕様書 21. 工事細部に関する事項
21-16-3 支払

員の指示に従って行うコンクリート構造物、インターロッキング舗装、アスファルト構造物の取壊しのコンクリートカッター、掘削、積込、運搬、廃材処理に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

単価表の項目	検測の単位
18－（17）	構造物等取壊し工
	コンクリート構造物取壊し（Type A）（T）
	コンクリート構造物取壊し（Type A）（S）
	コンクリート構造物取壊し（Type A）
	コンクリート構造物取壊し（Type B）（T）
	コンクリート構造物取壊し（Type B）（S）
	アスファルト舗装版取壊し（Type A）（T）
	アスファルト舗装版取壊し（Type A）（S）
	アスファルト舗装版取壊し（Type B）（T）
	アスファルト舗装版取壊し（Type B）（S）
	コンクリート舗装版取壊し（Type A）

21－17 交通規制工
21－17－1 種別

共通仕様書 19－3－2「種別」に下表を追加する。なお、交通規制工の種別における交通規制箇所、交通規制内の施工内容に関する単価表の項目については設計図に示す数量総括表のとおりとする。

単価表の項目	区分内容	規制時間	摘要
車線規制 L×N×M×T	「道路保全要領（路上作業編）」に規定する 走行車線規制及び追い 越し車線規制をいい、 設計図に示す交通規制 図に基づき実施するも の。	6:00～18:00 (7:00～17:00)	
車線規制 L×N×M×T （SB）		6:00～18:00 (7:00～17:00)	
車線規制 L×N×M×T （D）（昼夜）		規制設置日の 6:00～ 規制撤去日の 18:00 (規制可能期間中の 7:00～17:00)	単価項目中の(D) の中の数字は、規 制が連続する日数 を示す。
車線規制 L×N×M×T （D）（SA） （昼夜）		規制設置日の 6:00～ 規制撤去日の 18:00 (規制可能期間中の 7:00～17:00)	単価項目中の(D) の中の数字は、規 制が連続する日数 を示す。

42

正

員の指示に従って行うコンクリート構造物、インターロッキング舗装、アスファルト構造物の取壊しのコンクリートカッター、掘削、埋戻、積込、運搬、廃材処理に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。

単価表の項目	検測の単位
18－（17）	構造物等取壊し工
	コンクリート構造物取壊し（Type A）（T）
	コンクリート構造物取壊し（Type A）（S）
	コンクリート構造物取壊し（Type A）
	コンクリート構造物取壊し（Type B）（T）
	コンクリート構造物取壊し（Type B）（S）
	アスファルト舗装版取壊し（Type A）（T）
	アスファルト舗装版取壊し（Type A）（S）
	アスファルト舗装版取壊し（Type B）（T）
	アスファルト舗装版取壊し（Type B）（S）
	コンクリート舗装版取壊し（Type A）

21－17 交通規制工
21－17－1 種別

共通仕様書 19－3－2「種別」に下表を追加する。なお、交通規制工の種別における交通規制箇所、交通規制内の施工内容に関する単価表の項目については設計図に示す数量総括表のとおりとする。

単価表の項目	区分内容	規制時間	摘要
車線規制 L×N×M×T	「道路保全要領（路上作業編）」に規定する 走行車線規制及び追い 越し車線規制をいい、 設計図に示す交通規制 図に基づき実施するも の。	6:00～18:00 (7:00～17:00)	
車線規制 L×N×M×T （SB）		6:00～18:00 (7:00～17:00)	
車線規制 L×N×M×T （D）（昼夜）		規制設置日の 6:00～ 規制撤去日の 18:00 (規制可能期間中の 7:00～17:00)	単価項目中の(D) の中の数字は、規 制が連続する日数 を示す。
車線規制 L×N×M×T （D）（SA） （昼夜）		規制設置日の 6:00～ 規制撤去日の 18:00 (規制可能期間中の 7:00～17:00)	単価項目中の(D) の中の数字は、規 制が連続する日数 を示す。

42

備考



記載内容の訂正。



対象 誤	特記仕様書 22. 割掛対象表の項目に示す工事の内容 【雑工事費】 (3) 床版排水工の施工は、削孔機等により橋梁床版面を削孔後、排水パイプを設置し、橋梁床版と排水パイプの間を樹脂等により充填するものとする。 (4) 床版排水工の施工位置については、別途監督員と協議し定めるものとする。 2 1 - 3 4 - 5 数量の検測 床版排水工の数量の検測は、設計数量（箇所）で行うものとする。 2 1 - 3 4 - 6 支払 床版排水工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1箇所当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設コンクリート床版の鉄筋探査、削孔、廃材の運搬、排水パイプの据付等床版排水工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 <table><tr><td></td><td>単価表の項目</td><td>検測の単位</td></tr><tr><td>特一(16)</td><td>床版排水工</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>箇所</td></tr></table> 2 2. 割掛対象表の項目に示す工事の内容 対象表の項目に示す工事の内容は、共通仕様書第1章「表1-3 割掛対象表の項目に示す工事の内容」による他、次のとおりとする。なお、これに要する費用は関連する単価表の項目の単価に含まれるものとし、別途支払は行わないものとする。 【共通仮設費】 <table><tr><td>割掛対象表の項目名称</td><td>工事の内容</td><td>備考</td></tr><tr><td>有料道路料金費</td><td>切削オーバーレイ工、路面切削工及び構造物等取壊しの施工にあたり、舗装廃材及びコンクリート廃材の運搬に必要な有料道路料金費用をいう。</td><td></td></tr></table> 【雑工事費】 <table><tr><td>割掛対象表の項目名称</td><td>工事の内容</td><td>備考</td></tr><tr><td>仮路面標示費</td><td>東部湯の丸S A（上下線）および本線において、舗設完了後に行う仮路面標示（常温系塗料、幅5 c m）の施工に要する費用をいう。</td><td></td></tr><tr><td>仮路面標示消去費</td><td>東部湯の丸S A（上下線）において、仮路面標示（常温系塗料、幅5 c m）の消去に要する費用をいう。</td><td></td></tr></table> 62		単価表の項目	検測の単位	特一(16)	床版排水工			A	箇所	割掛対象表の項目名称	工事の内容	備考	有料道路料金費	切削オーバーレイ工、路面切削工及び構造物等取壊しの施工にあたり、舗装廃材及びコンクリート廃材の運搬に必要な有料道路料金費用をいう。		割掛対象表の項目名称	工事の内容	備考	仮路面標示費	東部湯の丸S A（上下線）および本線において、舗設完了後に行う仮路面標示（常温系塗料、幅5 c m）の施工に要する費用をいう。		仮路面標示消去費	東部湯の丸S A（上下線）において、仮路面標示（常温系塗料、幅5 c m）の消去に要する費用をいう。				
		単価表の項目	検測の単位																									
特一(16)	床版排水工																											
	A	箇所																										
割掛対象表の項目名称	工事の内容	備考																										
有料道路料金費	切削オーバーレイ工、路面切削工及び構造物等取壊しの施工にあたり、舗装廃材及びコンクリート廃材の運搬に必要な有料道路料金費用をいう。																											
割掛対象表の項目名称	工事の内容	備考																										
仮路面標示費	東部湯の丸S A（上下線）および本線において、舗設完了後に行う仮路面標示（常温系塗料、幅5 c m）の施工に要する費用をいう。																											
仮路面標示消去費	東部湯の丸S A（上下線）において、仮路面標示（常温系塗料、幅5 c m）の消去に要する費用をいう。																											
正	(3) 床版排水工の施工は、削孔機等により橋梁床版面を削孔後、排水パイプを設置し、橋梁床版と排水パイプの間を樹脂等により充填するものとする。 (4) 床版排水工の施工位置については、別途監督員と協議し定めるものとする。 2 1 - 3 4 - 5 数量の検測 床版排水工の数量の検測は、設計数量（箇所）で行うものとする。 2 1 - 3 4 - 6 支払 床版排水工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1箇所当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設コンクリート床版の鉄筋探査、削孔、廃材の運搬、排水パイプの据付等床版排水工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 <table><tr><td></td><td>単価表の項目</td><td>検測の単位</td></tr><tr><td>特一(16)</td><td>床版排水工</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>箇所</td></tr></table> 2 2. 割掛対象表の項目に示す工事の内容 対象表の項目に示す工事の内容は、共通仕様書第1章「表1-3 割掛対象表の項目に示す工事の内容」による他、次のとおりとする。なお、これに要する費用は関連する単価表の項目の単価に含まれるものとし、別途支払は行わないものとする。 【共通仮設費】 <table><tr><td>割掛対象表の項目名称</td><td>工事の内容</td><td>備考</td></tr><tr><td>有料道路料金費</td><td>切削オーバーレイ工、路面切削工及び構造物等取壊しの施工にあたり、舗装廃材及びコンクリート廃材の運搬に必要な有料道路料金費用をいう。</td><td></td></tr></table> 【雑工事費】 <table><tr><td>割掛対象表の項目名称</td><td>工事の内容</td><td>備考</td></tr><tr><td>残アスファルト合材等の取り除き費</td><td>路面切削工において上・下部及び橋梁部のレベリング層を含めた改良を実施する場合における、路面切削後の床版面に残ったアスファルト合材やロードヒーティングの撤去に要する費用をいう。</td><td></td></tr><tr><td>仮路面標示費</td><td>東部湯の丸S A（上下線）および本線において、舗設完了後に行う仮路面標示（常温系塗料、幅5 c m）の施工に要する費用をいう。</td><td></td></tr><tr><td>仮路面標示消去費</td><td>東部湯の丸S A（上下線）において、仮路面標示（常温系塗料、幅5 c m）の消去に要する費用をいう。</td><td></td></tr></table> 62		単価表の項目	検測の単位	特一(16)	床版排水工			A	箇所	割掛対象表の項目名称	工事の内容	備考	有料道路料金費	切削オーバーレイ工、路面切削工及び構造物等取壊しの施工にあたり、舗装廃材及びコンクリート廃材の運搬に必要な有料道路料金費用をいう。		割掛対象表の項目名称	工事の内容	備考	残アスファルト合材等の取り除き費	路面切削工において上・下部及び橋梁部のレベリング層を含めた改良を実施する場合における、路面切削後の床版面に残ったアスファルト合材やロードヒーティングの撤去に要する費用をいう。		仮路面標示費	東部湯の丸S A（上下線）および本線において、舗設完了後に行う仮路面標示（常温系塗料、幅5 c m）の施工に要する費用をいう。		仮路面標示消去費	東部湯の丸S A（上下線）において、仮路面標示（常温系塗料、幅5 c m）の消去に要する費用をいう。	
	単価表の項目	検測の単位																										
特一(16)	床版排水工																											
	A	箇所																										
割掛対象表の項目名称	工事の内容	備考																										
有料道路料金費	切削オーバーレイ工、路面切削工及び構造物等取壊しの施工にあたり、舗装廃材及びコンクリート廃材の運搬に必要な有料道路料金費用をいう。																											
割掛対象表の項目名称	工事の内容	備考																										
残アスファルト合材等の取り除き費	路面切削工において上・下部及び橋梁部のレベリング層を含めた改良を実施する場合における、路面切削後の床版面に残ったアスファルト合材やロードヒーティングの撤去に要する費用をいう。																											
仮路面標示費	東部湯の丸S A（上下線）および本線において、舗設完了後に行う仮路面標示（常温系塗料、幅5 c m）の施工に要する費用をいう。																											
仮路面標示消去費	東部湯の丸S A（上下線）において、仮路面標示（常温系塗料、幅5 c m）の消去に要する費用をいう。																											
備考	表における記載内容の訂正。																											

追加


対象 誤	特記仕様書 21. 工事細部に関する事項 21-28-6 支払 21-28-3 舗装廃材の処理 (1) 既設舗装の切削及び剥取り等により発生した廃材の処理場所は、本特記仕様書16-2「建設副産物の活用等」に示すとおりとし、運搬処理に要する費用については関連する単価項目に含まれるものとし、別途支払いは行わないものとする。 (2) 路面切削工Bの既設舗装の平均深さ1.0cmと既設ロードヒーティングについては、建設混合廃棄物として最終処分するものとする。なお、運搬処理に要する費用については関連する単価項目に含まれるものとし、別途支払いは行わないものとする。 21-28-4 施工 (1) 路面切削工の施工は、路面切削機等により橋梁床版面を損傷させないよう細心の注意を払いながら既設床版面まで切削するものとし、既設舗装が橋梁床版面に残存しないよう入念に除去するものとする。 (2) 排水ます等及び伸縮装置近傍で施工する場合は、廃材等が装置内に落下しないように十分注意を払い施工しなければならない。なお、当該工事により廃材等が散乱した場合には、受注者の責任で清掃しなければならない。 (3) 伸縮装置、排水構造物付近は人力施工により、それらに損傷を与えないよう入念に施工しなければならない。なお、受注者は、施工機械及び施工方法についてあらかじめ詳細な施工計画を立てて監督員に提出しなければならない。 21-28-5 数量の検測 路面切削工の数量の検測は、設計数量(m3)で行うものとする。 21-28-6 支払 路面切削工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1 m3当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設路面の切断、切削、端部のはつり、既設ロードヒーティングの除去、切削面の清掃、運搬廃材処理等路面切削工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 <table><tr><th></th><th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td>特一(10)</td><td>路面切削工</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>m3</td></tr><tr><td></td><td>B</td><td>m3</td></tr></table> 21-29 ループコイル敷設工 21-29-1 定義 ループコイル敷設工とは、設計図書及び監督員の指示に従い、支障となる交通量計測装置用ループコイルを一時切断し、新規に設置することをいう。		単価表の項目	検測の単位	特一(10)	路面切削工			A	m3		B	m3
	単価表の項目	検測の単位											
特一(10)	路面切削工												
	A	m3											
	B	m3											
正	21-28-3 舗装廃材の処理 (1) 既設舗装の切削及び剥取り等により発生した廃材の処理場所は、本特記仕様書16-2「建設副産物の活用等」に示すとおりとし、運搬処理に要する費用については関連する単価項目に含まれるものとし、別途支払いは行わないものとする。 (2) 路面切削工Bの既設舗装の平均深さ1.0cmと既設ロードヒーティングについては、建設混合廃棄物として最終処分するものとする。なお、運搬処理に要する費用については関連する単価項目に含まれるものとし、別途支払いは行わないものとする。 21-28-4 施工 (1) 路面切削工の施工は、路面切削機等により橋梁床版面を損傷させないよう細心の注意を払いながら既設床版面まで切削するものとし、既設舗装が橋梁床版面に残存しないよう入念に除去するものとする。 (2) 排水ます等及び伸縮装置近傍で施工する場合は、廃材等が装置内に落下しないように十分注意を払い施工しなければならない。なお、当該工事により廃材等が散乱した場合には、受注者の責任で清掃しなければならない。 (3) 伸縮装置、排水構造物付近は人力施工により、それらに損傷を与えないよう入念に施工しなければならない。なお、受注者は、施工機械及び施工方法についてあらかじめ詳細な施工計画を立てて監督員に提出しなければならない。 21-28-5 数量の検測 路面切削工の数量の検測は、設計数量(m3)で行うものとする。 21-28-6 支払 路面切削工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、1 m3当たりの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設路面の切断、切削、端部のはつり、既設ロードヒーティングの処分、切削面の清掃、運搬廃材処理等路面切削工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 <table><tr><th></th><th>単価表の項目</th><th>検測の単位</th></tr><tr><td>特一(10)</td><td>路面切削工</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>m3</td></tr><tr><td></td><td>B</td><td>m3</td></tr></table> 21-29 ループコイル敷設工 21-29-1 定義 ループコイル敷設工とは、設計図書及び監督員の指示に従い、支障となる交通量計測装置用ループコイルを一時切断し、新規に設置することをいう。		単価表の項目	検測の単位	特一(10)	路面切削工			A	m3		B	m3
	単価表の項目	検測の単位											
特一(10)	路面切削工												
	A	m3											
	B	m3											
備考	記載内容の訂正。												

対象	割掛対象表 No. 3																																																																																																																																																										
誤	*** 割掛対象表 *** No. 3 <table><tr><th>割掛先契約項目 レベリング工 C1</th><th>◎ 共通仮設費</th><th>工事用機械運搬費</th><th>舗装修繕工事機械現場内移動費</th><th>はく離抵抗試験費</th><th>有料道路路料金費</th><th>◎ 雑工事費</th><th>残アスファルト合材等の取り除き費</th><th>事前コア採取費</th><th>仮路面標示費</th><th>仮路面標示消去費</th><th>路面標示消去費</th><th>◎ 試験費</th><th>試験舗装費</th></tr><tr><td>割掛先契約項目 レベリング工 C1</td><td>変動・固定の区分</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td></td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td></td><td>固</td></tr><tr><td>構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) (T)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) (S)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type B) (T)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type B) (S)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (T)</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (S)</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type B) (T)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type B) (S)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。 アスファルト構造物取壊し (Type A) (S) アスファルト構造物取壊し (Type B) (S)	割掛先契約項目 レベリング工 C1	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	舗装修繕工事機械現場内移動費	はく離抵抗試験費	有料道路路料金費	◎ 雑工事費	残アスファルト合材等の取り除き費	事前コア採取費	仮路面標示費	仮路面標示消去費	路面標示消去費	◎ 試験費	試験舗装費	割掛先契約項目 レベリング工 C1	変動・固定の区分	固	固	固	固		固	固	固	固	固		固	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) (T)			○		○									構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) (S)			○											構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A)			○		○									構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type B) (T)			○		○									構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type B) (S)			○											構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (T)		○	○		○				○	○	○			構造物取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (S)		○	○											構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type B) (T)			○		○				○	○	○			構造物取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type B) (S)			○										
割掛先契約項目 レベリング工 C1	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	舗装修繕工事機械現場内移動費	はく離抵抗試験費	有料道路路料金費	◎ 雑工事費	残アスファルト合材等の取り除き費	事前コア採取費	仮路面標示費	仮路面標示消去費	路面標示消去費	◎ 試験費	試験舗装費																																																																																																																																														
割掛先契約項目 レベリング工 C1	変動・固定の区分	固	固	固	固		固	固	固	固	固		固																																																																																																																																														
構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) (T)			○		○																																																																																																																																																						
構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) (S)			○																																																																																																																																																								
構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A)			○		○																																																																																																																																																						
構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type B) (T)			○		○																																																																																																																																																						
構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type B) (S)			○																																																																																																																																																								
構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (T)		○	○		○				○	○	○																																																																																																																																																
構造物取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (S)		○	○																																																																																																																																																								
構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type B) (T)			○		○				○	○	○																																																																																																																																																
構造物取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type B) (S)			○																																																																																																																																																								
正	*** 割掛対象表 *** No. 3 <table><tr><th>割掛先契約項目 レベリング工 C1</th><th>◎ 共通仮設費</th><th>工事用機械運搬費</th><th>舗装修繕工事機械現場内移動費</th><th>はく離抵抗試験費</th><th>有料道路路料金費</th><th>◎ 雑工事費</th><th>残アスファルト合材等の取り除き費</th><th>事前コア採取費</th><th>仮路面標示費</th><th>仮路面標示消去費</th><th>路面標示消去費</th><th>◎ 試験費</th><th>試験舗装費</th></tr><tr><td>割掛先契約項目 レベリング工 C1</td><td>変動・固定の区分</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td></td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td>固</td><td></td><td>固</td></tr><tr><td>構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) (T)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) (S)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type B) (T)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type B) (S)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (T)</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (S)</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type B) (T)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type B) (S)</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 注) 変動・固定の部分…“固”は固定先割掛を示し、空白は変動的割掛を示す。 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (S) アスファルト舗装版取壊し (Type B) (S)	割掛先契約項目 レベリング工 C1	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	舗装修繕工事機械現場内移動費	はく離抵抗試験費	有料道路路料金費	◎ 雑工事費	残アスファルト合材等の取り除き費	事前コア採取費	仮路面標示費	仮路面標示消去費	路面標示消去費	◎ 試験費	試験舗装費	割掛先契約項目 レベリング工 C1	変動・固定の区分	固	固	固	固		固	固	固	固	固		固	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) (T)			○		○									構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) (S)			○											構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A)			○		○									構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type B) (T)			○		○									構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type B) (S)			○											構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (T)		○	○		○				○	○	○			構造物取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (S)		○	○											構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type B) (T)			○		○				○	○	○			構造物取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type B) (S)			○										
割掛先契約項目 レベリング工 C1	◎ 共通仮設費	工事用機械運搬費	舗装修繕工事機械現場内移動費	はく離抵抗試験費	有料道路路料金費	◎ 雑工事費	残アスファルト合材等の取り除き費	事前コア採取費	仮路面標示費	仮路面標示消去費	路面標示消去費	◎ 試験費	試験舗装費																																																																																																																																														
割掛先契約項目 レベリング工 C1	変動・固定の区分	固	固	固	固		固	固	固	固	固		固																																																																																																																																														
構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) (T)			○		○																																																																																																																																																						
構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A) (S)			○																																																																																																																																																								
構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type A)			○		○																																																																																																																																																						
構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type B) (T)			○		○																																																																																																																																																						
構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し (Type B) (S)			○																																																																																																																																																								
構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (T)		○	○		○				○	○	○																																																																																																																																																
構造物取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (S)		○	○																																																																																																																																																								
構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type B) (T)			○		○				○	○	○																																																																																																																																																
構造物取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type B) (S)			○																																																																																																																																																								
備考	「構造物取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type A) (S)」へ変更 「構造物取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (Type B) (S)」へ変更																																																																																																																																																										

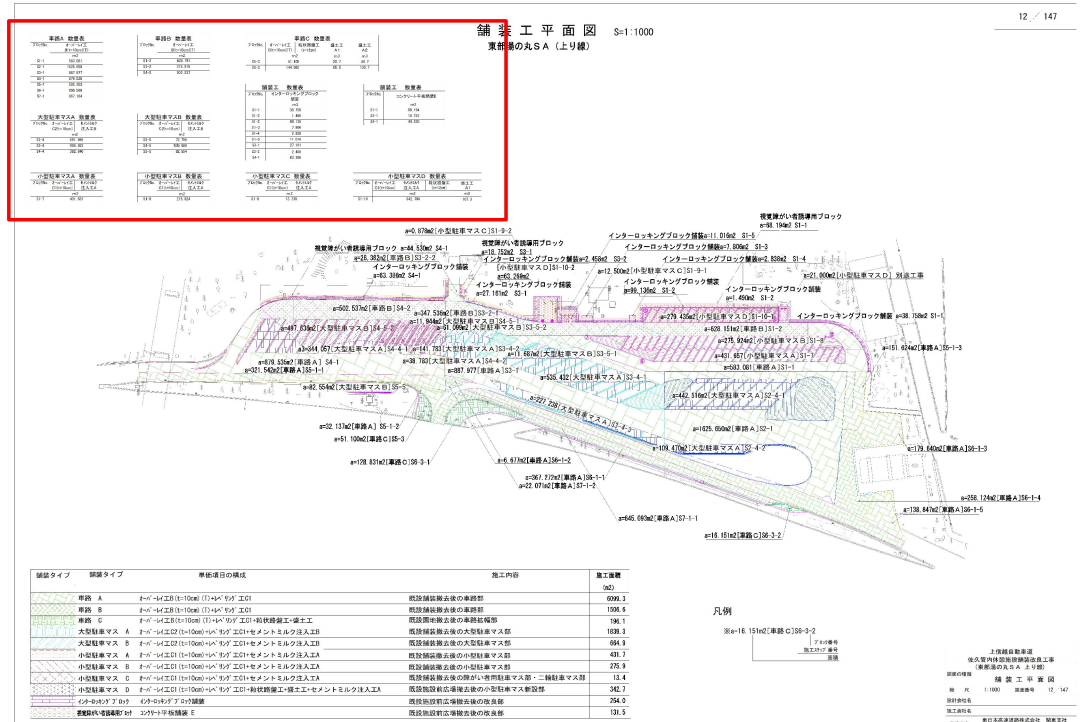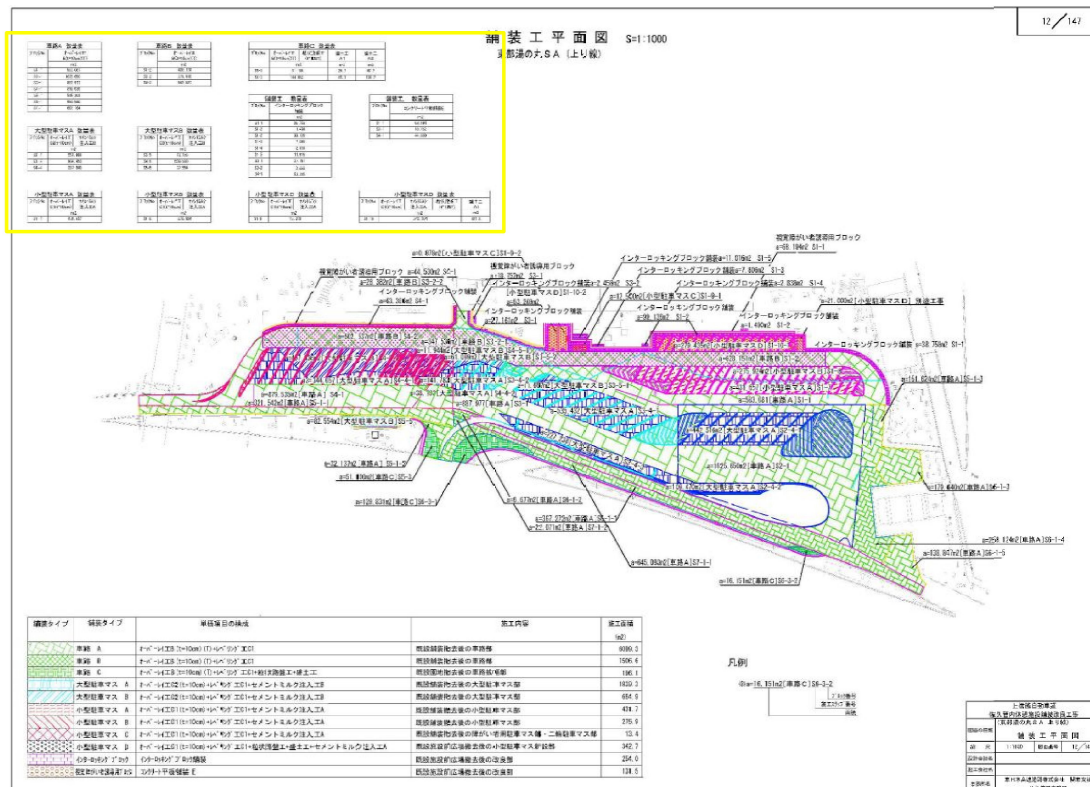


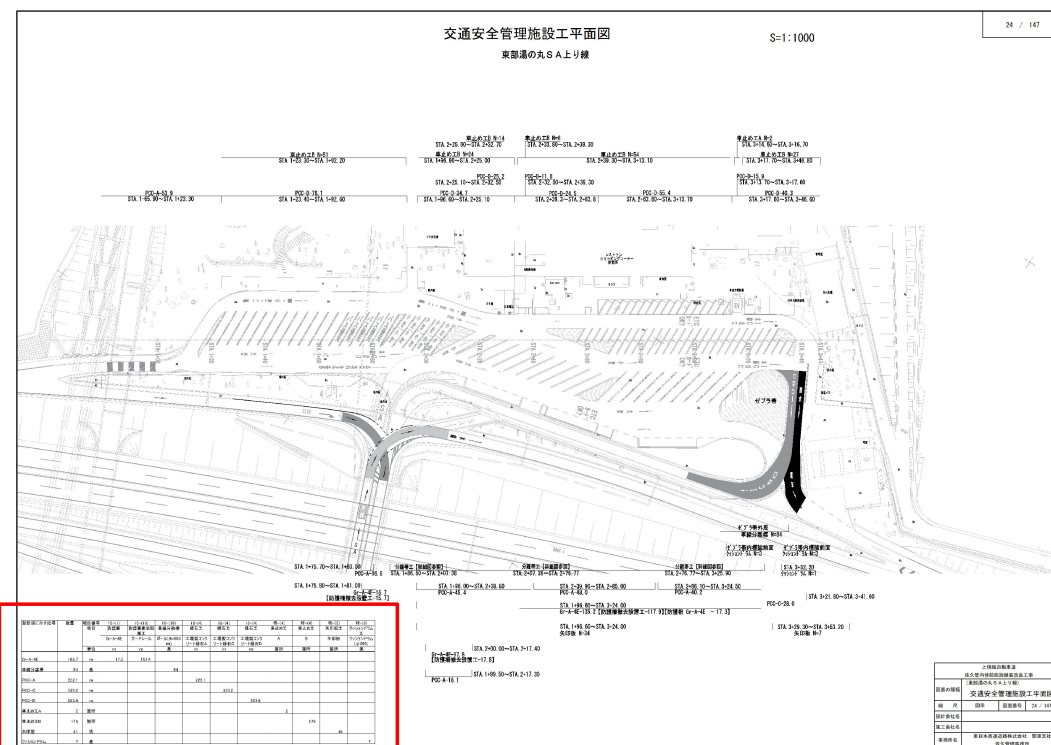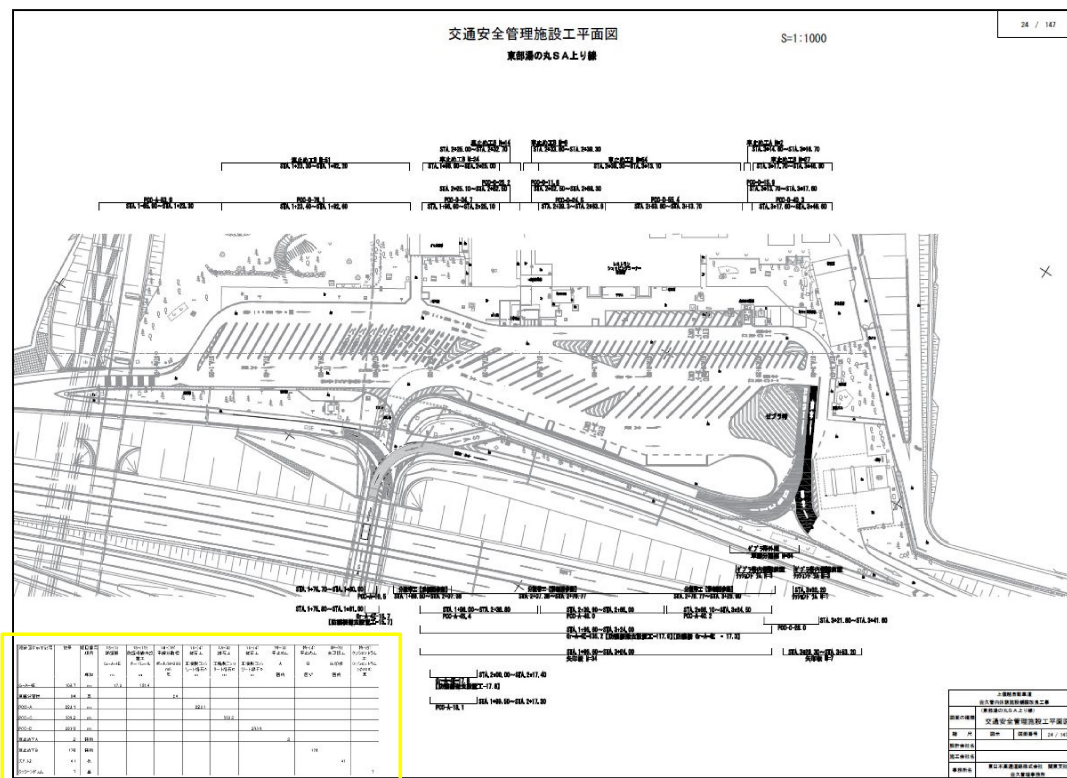

項目	(I)-(J)	(K)-(L)	(M)-(N)	(O)-(P)
項目	普通型工事	特殊型工事	普通型工事	特殊型工事
数量	1000m ³	1000m ³	1000m ³	1000m ³
単位	m ³	m ³	m ³	m ³
単価	3605	8778	1244	96

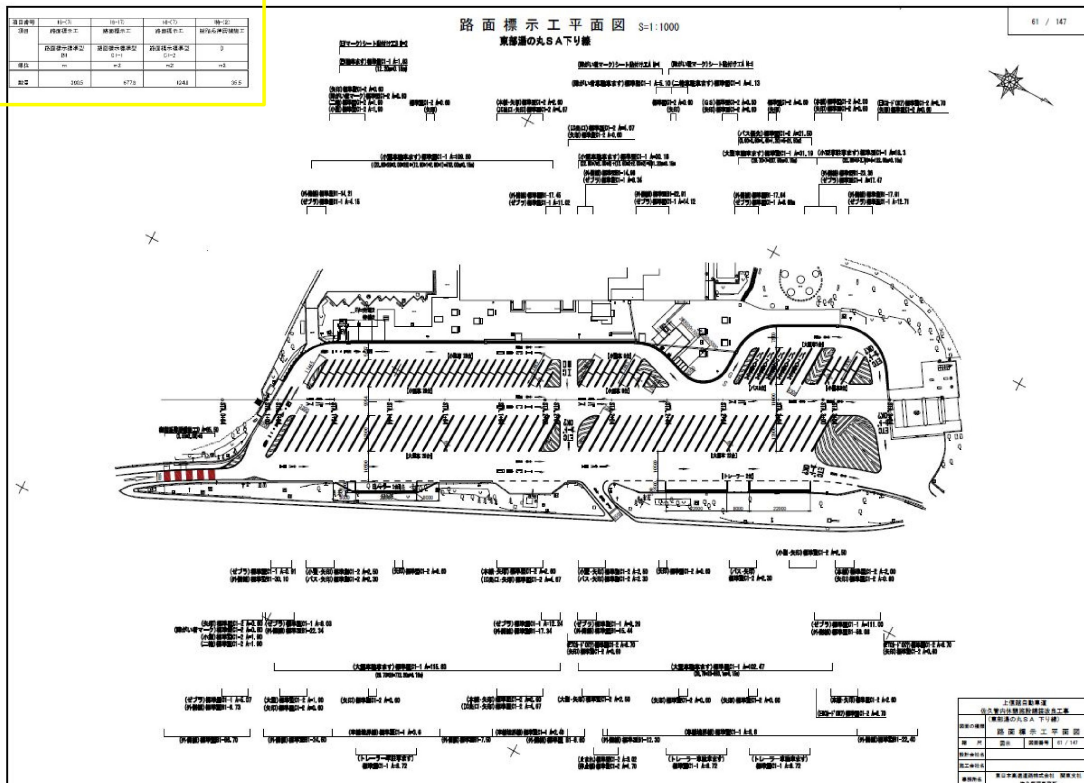

編號	15-(1)	15-(1)	15-(2)	總計
項目	防盜磁卡工	防盜磁卡工	防盜磁卡工	防盜磁卡工
	防盜磁卡機車型 B1	防盜磁卡機車型 CS-1	防盜磁卡機車型 CS-2	0
單位	m	m ²	m ²	m ²
數量	390.5	677.8	124.6	55.5

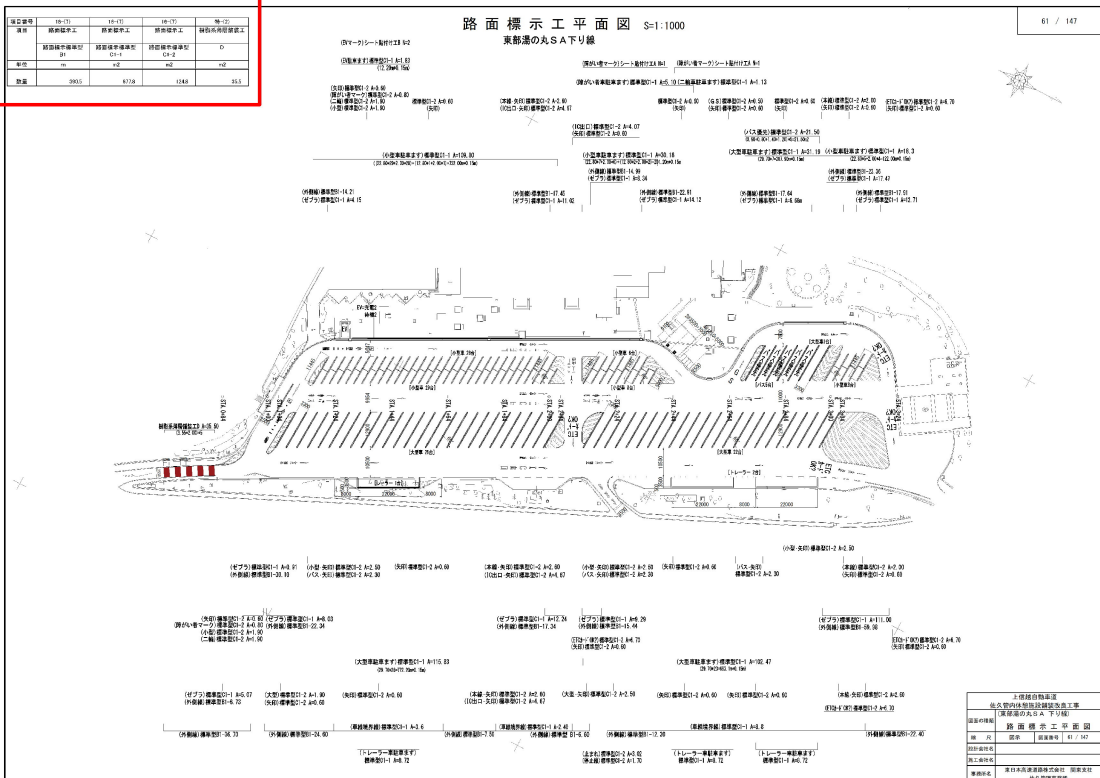


対象 誤	(参考図) 施工ステップ図 その1 S=1:1000 東部道の丸SA（上り線） 舗装端部すり付け概況図 断面方向 仮設A0-7断面図 仮設A0-7平面図 Step1 施工面積 A=2,850m² 計画施工日数 5日 路面標高消去(15cm換算) 138.2m 仮路面標高消去(W=5cm) - m 仮路面標高消去(W=5cm) - m BS GS 上代線自動車道 他方管内側側方路側帯付工事 東部道の丸SA（上り線） 施工ステップ図 その1 No. 1 図面 図面番号 参1/参17 設計者 設計 施工者 東日本高速道路株式会社 関東支社 監理者 国土交通省
正	(参考図) 施工ステップ図 その1 S=1:1000 東部道の丸SA（上り線） 舗装端部すり付け概況図 断面方向 仮設A0-7断面図 仮設A0-7平面図 Step1 施工面積 A=2,850m² 計画施工日数 5日 路面標高消去(15cm換算) 138.2m 仮路面標高消去(W=5cm) - m 仮路面標高消去(W=5cm) - m BS GS 上代線自動車道 他方管内側側方路側帯付工事 東部道の丸SA（上り線） 施工ステップ図 その1 No. 1 図面 図面番号 参1/参17 設計者 設計 施工者 東日本高速道路株式会社 関東支社 監理者 国土交通省
備考	文字の潰れによる図面の差替え

(参考図) 施工ステップ図 その2 S=1:1000

東部湯の丸SA（上り線）

舗装端部すり付け概況図

外周:約213m

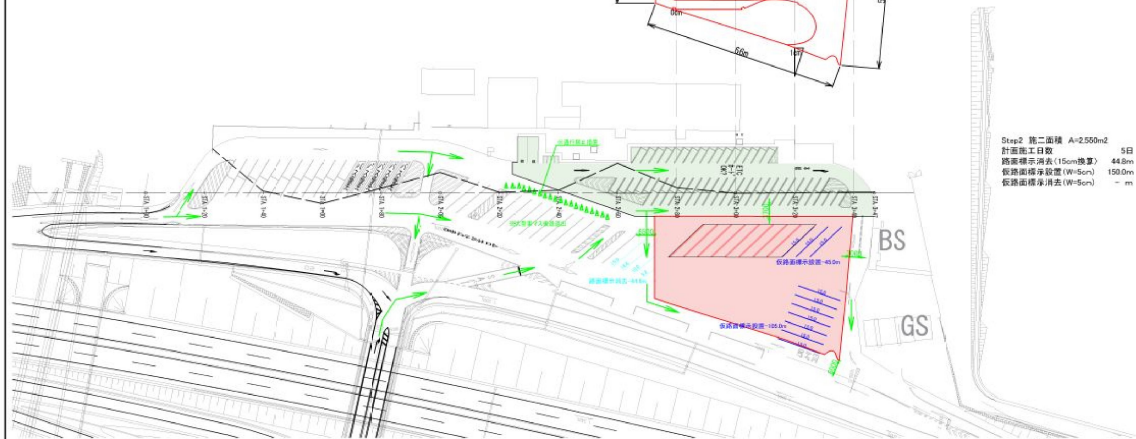断面方向 

Step2 第二面積 A=2550m²
計畫施工日數
路面標示消去(15cm換算)
仮路面標示設置(W=5cm)
仮路面標示消去(W=5cm)

[illegible]


上野新自由車道 伏久管内休閑施設建設改良工事 (東部通の丸 B A 上り線)			
事業の種類	施工ステップ図 その2		
種 別	図示	図面番号	※2/※1
設計委託先			
施工委託先			
事業所名	東日本鉄道建設株式会社 新東横田 社会管理事務所		

(参考図) 施工ステップ図 その2 S=1:1000

東部湯の丸SA（上り線）

舗装端部すり付け概況図

外周:約213m

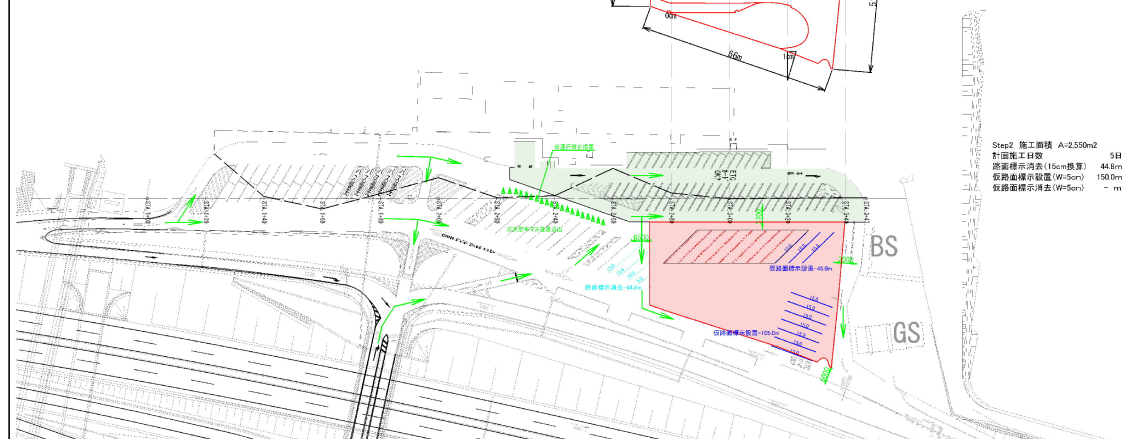断面方向 



Step2 施工面積 A=2,550m ²	
計画施工日数	
路面標示消去(15cm換算)	4
仮路面標示設置(W=5cm)	15
仮路面標示消去(W=5cm)	-



代例	交通整備費A	計画事業：計画道路工事費Aと新築
道工中の中心部道路で支線道路と	40台以上	①作業エリア内（工事車両の入口、作業箇所等）
道工中の大型トラックが頻りに	30台以上	②③A、大型トラックが通過可能な
道工中の①（入庫する）建設台数	20台以上	
道工中の仮設等環境先行方向		
道工中の仮設：注意事項		
施工区間		
施工区間の延長		

上信越自動車道 往久曽内休養施設建設改良工事 (東郡津の丸 8Aより起)			
実施の時期	第Ⅲステップ図		その2
編 氏	図示	図面番号	参2/参17
設計会社名			
施工会社名			
発注元名	東日本高速道路株式会社 四国支社		

対象 誤	設計図 参3/参17 参3 / 参17 (参考図) 施工ステップ図 その3 S=1:1000 東部渚の丸SA (上り線) 舗装端部すり付け概況図 Step3 施工面積 A=2,125m² 計画施工口数 9口 計画標高消高 (15cm敷置) 34.1m 仮設標高消高 (W=5cm) 21.6m 仮設標高消高 (W=10cm) - m <table> <tr> <td> 注釈 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 </td><td> 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 </td></tr> </table> <table> <tr> <td> 上掲図面参照 施工管内歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 </td><td> 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 </td></tr> </table>	注釈 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保	歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保	上掲図面参照 施工管内歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事	歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事
注釈 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保	歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保				
上掲図面参照 施工管内歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事	歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事				
正	設計図 参3/参17 参3 / 参17 (参考図) 施工ステップ図 その3 S=1:1000 東部渚の丸SA (上り線) 舗装端部すり付け概況図 Step3 施工面積 A=2,125m² 計画施工口数 9口 計画標高消高 (15cm敷置) 34.1m 仮設標高消高 (W=5cm) 21.6m 仮設標高消高 (W=10cm) - m <table> <tr> <td> 注釈 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 </td><td> 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 </td></tr> </table> <table> <tr> <td> 上掲図面参照 施工管内歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 </td><td> 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 </td></tr> </table>	注釈 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保	歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保	上掲図面参照 施工管内歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事	歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事
注釈 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保 施工中の歩道部分の歩道幅員確保 歩道幅員確保	歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保 歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保、歩道幅員確保				
上掲図面参照 施工管内歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事	歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事 歩道幅員確保工事				
備考	文字の潰れによる図面の差替え				


対象 誤	(参考図) 施工ステップ図 その4 S=1:1000 東部溝の丸SA (上り線) 舗装端部すり付け概況図 126m 外周: 約270m 断面方向 112m Step4 施工面積 A=2296m² 計画施工日数 5日 路面標示消去 (15cm幅員) - m 側溝標準示設置 (W=5cm) - m 側溝標準示消去 (W=5cm) 216m 凡例 赤線 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備 緑線 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備 赤線 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備 赤線 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備
正	(参考図) 施工ステップ図 その4 S=1:1000 東部溝の丸SA (上り線) 舗装端部すり付け概況図 126m 外周: 約270m 断面方向 112m Step4 施工面積 A=2296m² 計画施工日数 5日 路面標示消去 (15cm幅員) - m 側溝標準示設置 (W=5cm) - m 側溝標準示消去 (W=5cm) 216m 凡例 赤線 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備 緑線 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備 赤線 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備 赤線 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備 施工時の仮設柵や安全確保設備
備考	文字の潰れによる図面の差替え

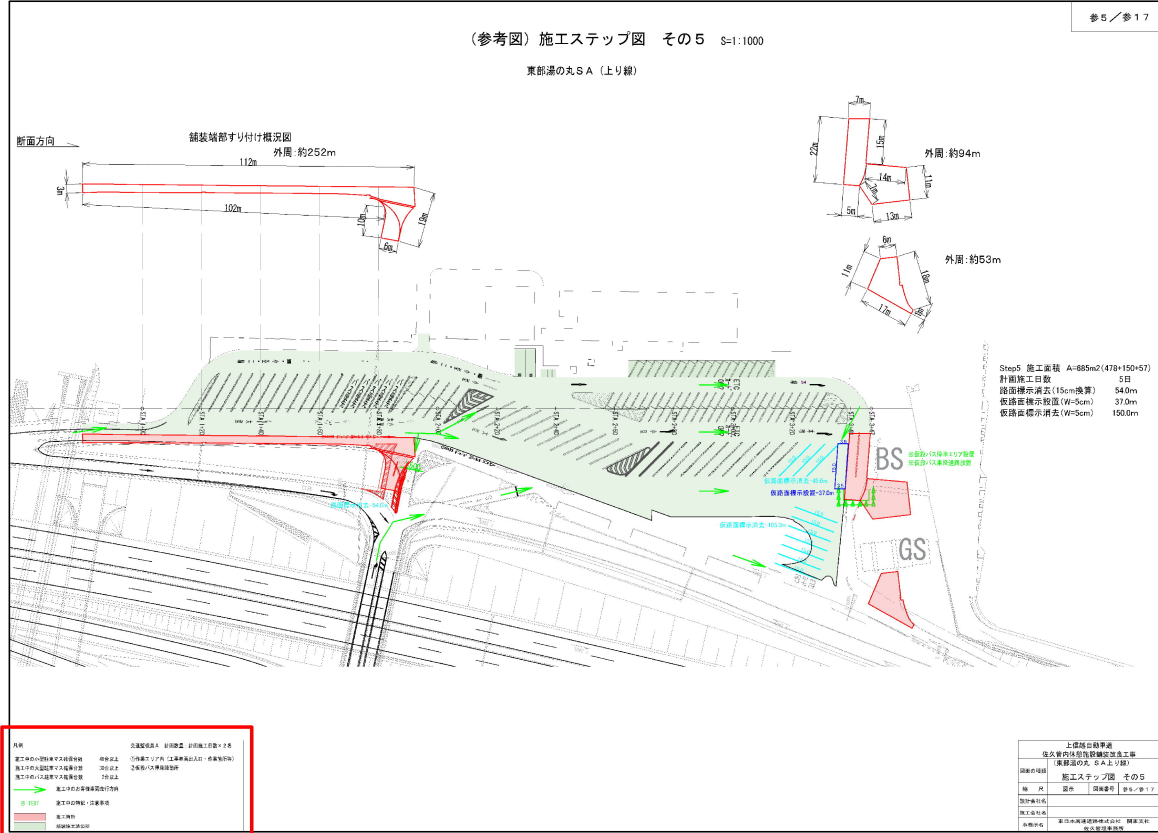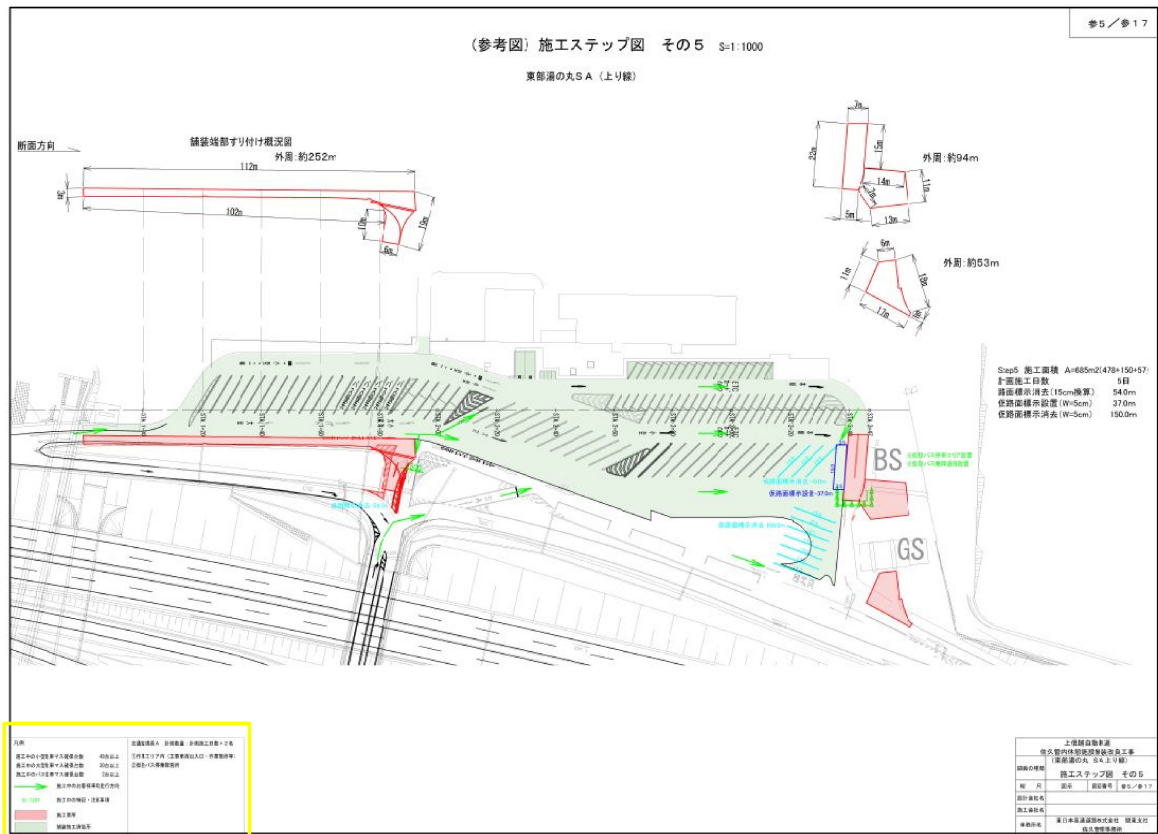

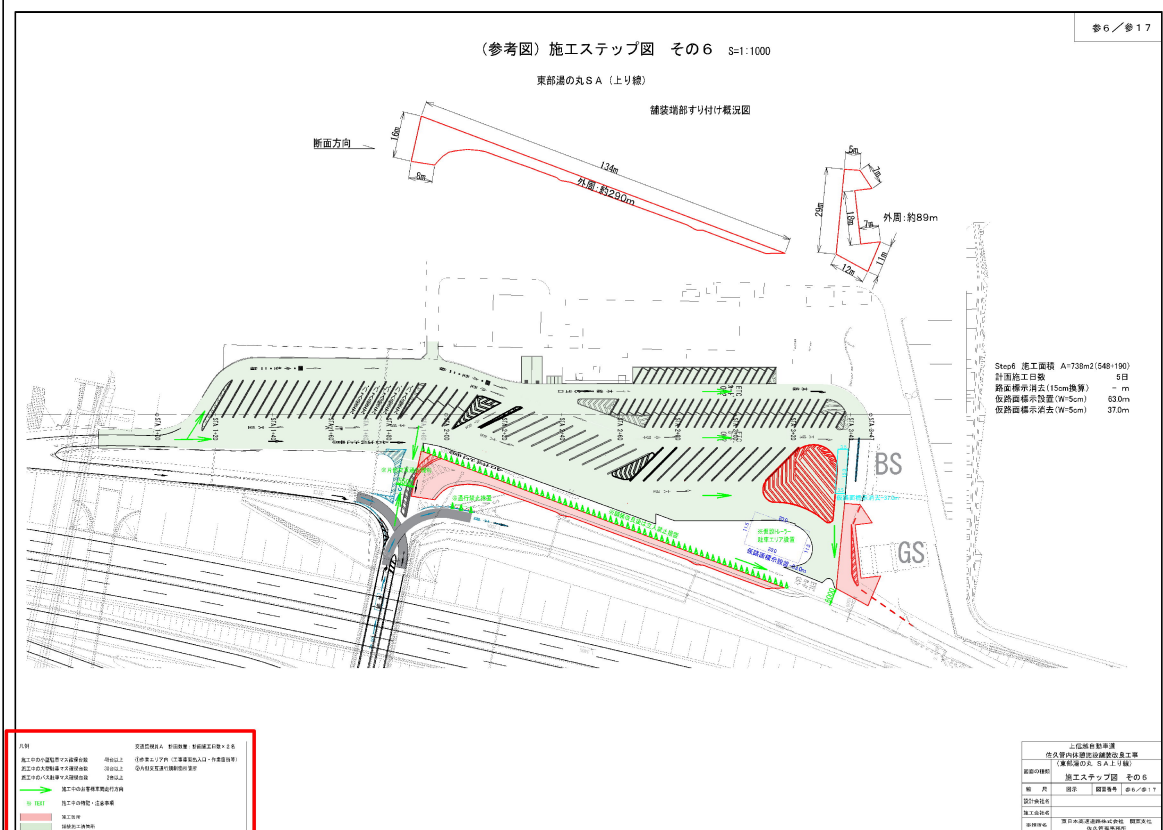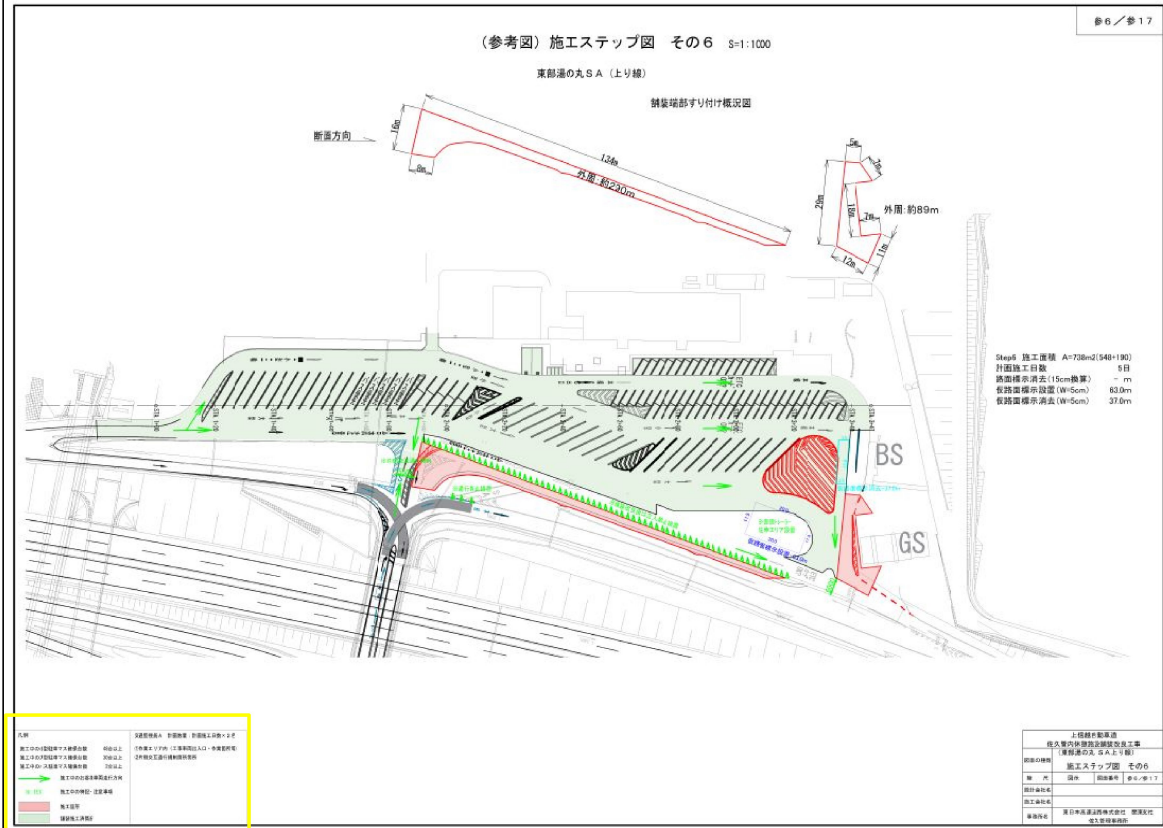

対象 誤	(参考図) 施工ステップ図 その7 S=1:1000 東部港の丸SA (上り線) 舗装端部すり付け概況図 断面方向 凡例 施工中心位置線より道路幅員 施工中心位置線より道路幅員 施工中心位置線より道路幅員 施工中心位置線より道路幅員 施工中心位置線より道路幅員 道路幅員 道路幅員 道路幅員 道路幅員 道路幅員 Step7 施工面積 A=925m² 計画施工日数 5日 計画標準歩法 (15cm幅員) 102.0m 仮設標準歩法 (W=5cm) ~ m 仮設標準歩法 (W=5cm) 63.0m 上り線側道路幅員 施工中心位置線より道路幅員 道路幅員 道路幅員 道路幅員 道路幅員
正	(参考図) 施工ステップ図 その7 S=1:1000 東部港の丸SA (上り線) 舗装端部すり付け概況図 断面方向 凡例 施工中心位置線より道路幅員 施工中心位置線より道路幅員 施工中心位置線より道路幅員 施工中心位置線より道路幅員 施工中心位置線より道路幅員 道路幅員 道路幅員 道路幅員 道路幅員 道路幅員 Step7 施工面積 A=925m² 計画施工日数 5日 計画標準歩法 (15cm幅員) 102.0m 仮設標準歩法 (W=5cm) ~ m 仮設標準歩法 (W=5cm) 63.0m 上り線側道路幅員 施工中心位置線より道路幅員 道路幅員 道路幅員 道路幅員 道路幅員
備考	文字の潰れによる図面の差替え


対象 誤	設計図 参8/参17	参8 / 参17 〔参考図〕施工程序図 その1 S=1:1000 東部道の丸SA（下り線） Step1 計画施工工程 2日 路面標示消去 (15cm幅員) 1500.0m 仮設道路標示設置 (W=5cm) 1050.0m 仮設道路標示消去 (W=5cm) - m <table><tr><th>凡例</th><th>仮設道路標示</th><th>計画施工工程</th><th>実施施工工程</th></tr><tr><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">上級道路改良工事</th></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr></table>	凡例	仮設道路標示	計画施工工程	実施施工工程	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	上級道路改良工事		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向	
凡例	仮設道路標示	計画施工工程	実施施工工程																																			
計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向																																			
計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向																																			
計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向																																			
上級道路改良工事																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
正		参8 / 参17 〔参考図〕施工程序図 その1 S=1:1000 東部道の丸SA（下り線） Step1 計画施工工程 2日 路面標示消去 (15cm幅員) 1500.0m 仮設道路標示設置 (W=5cm) 1050.0m 仮設道路標示消去 (W=5cm) - m <table><tr><th>凡例</th><th>仮設道路標示</th><th>計画施工工程</th><th>実施施工工程</th></tr><tr><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td><td>計画施工工程の進行方向</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">上級道路改良工事</th></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr><tr><td colspan="2">計画施工工程の進行方向</td></tr></table>	凡例	仮設道路標示	計画施工工程	実施施工工程	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	上級道路改良工事		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向		計画施工工程の進行方向	
凡例	仮設道路標示	計画施工工程	実施施工工程																																			
計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向																																			
計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向																																			
計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向	計画施工工程の進行方向																																			
上級道路改良工事																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
計画施工工程の進行方向																																						
備考	文字の潰れによる図面の差替え																																					

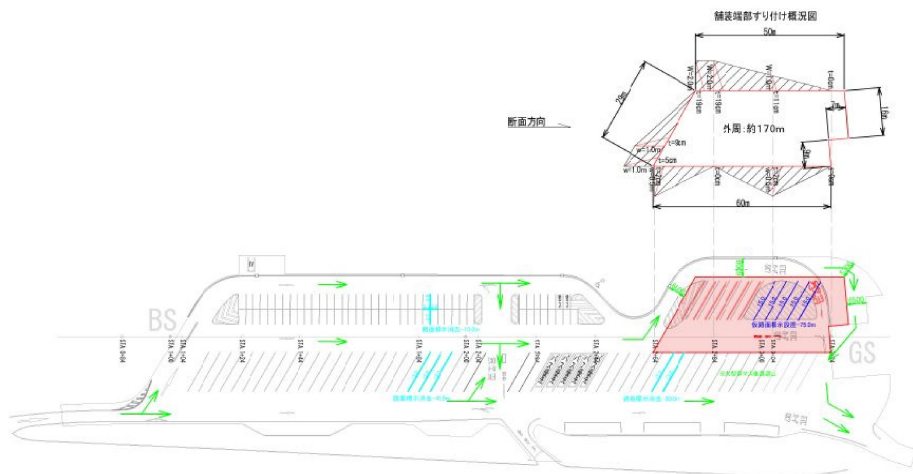

Step2 施工面積	A=1,433m ²
計画施工日数	5日
路面標示消去 (15cm換算)	900m
仮路標示設置 (W=5cm)	750m
仮路標示消去 (W=5cm)	- m

高橋 施工中の小型コンクリート盛土等 施工中の大型コンクリート盛土等 施工途中の盛土等 → 施工中の盛土等保護掘削方向 ※ 注意 施工中の掘削・圧入等時 施工・掘削 保護盛土の掘削	交通規制係員 A 的側面観 計測及び計測・写真 ①作業エリア内 工事車両進入口・作業開始前 ②人、大型機具・圧入機等掘削箇所
---	--

上信越自動車道			
徳久管内陸形岩盤改良工事 (東部道路の、S/A下り線)			
施工スナップ図 その2			
図面の種類	図示	図面番号	参り/参り
版 次			
図面作成者			
図面検定者			
承認者	東日本高速道路株式会社 関係者		

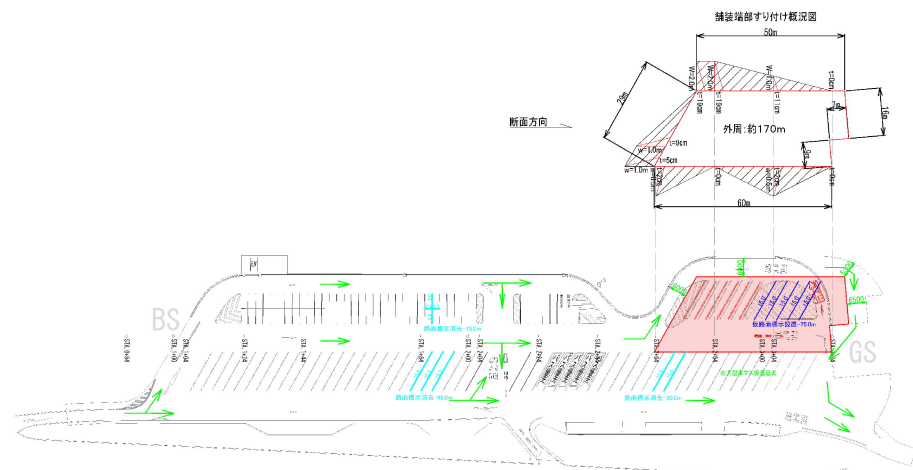


Step2 施工面積	A=1,433m ²
計画施工日数	5日
路面標示消去(15cm換算)	90.0m
仮路面標示設置(W=5cm)	75.0m
仮路面標示消去(W=5cm)	- m

凡例	交通型住宅A	計画型住宅B	計画型住宅C	住宅C
居住中の全世帯で入居希望	5割以上			
居住中の大規模な入居希望	45割以上			
居住中の大規模な入居希望	2割以上			
→ 施工中の全世帯で入居希望				
※ 10%	施工中の全世帯で入居希望			
	施工中の全世帯で入居希望			
	施工中の全世帯で入居希望			

上信越自動車道 松久管内体形調整促進改良工事 (東部道の丸SA下り線)		
施工ステップ図 その2		
図 尺	図示	図番番号 歩9/歩1
設計会社名		
施工会社名		
監理者名	東日本高速道路株式会社 関東支社 松久管内体形調整促進改良工事	

(参考図) 施工ステップ図 その3 S=1:1000

東部湯の丸SA（下り線）

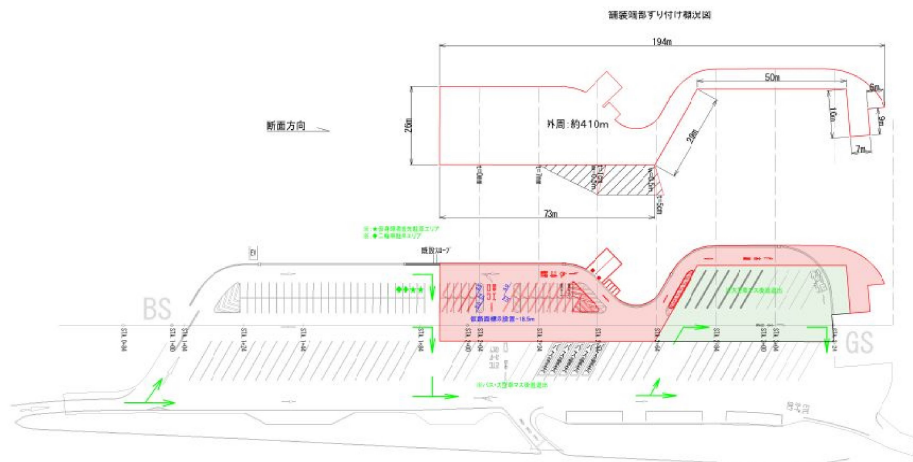


Step3 施工面積	A=2.319m ²
計画施工日数	5
路面標示消去(15cm換算)	-
仮路面標示設置(W=5cm)	18.5
仮路面標示消去(W=5cm)	-

[illegible]

上環橋台動静調査		
竹久管内橋台部設置改良工事 (床修造のため、おんり線)		
調査の種類	施工ステップ図 その3	
期 次	国庫	国庫番号 参10/参17
設計者氏名		
施工者氏名		
事業所名	東日本港湾建設株式会社 調査室	

(参考図) 施工ステップ図 その3 S=1:1000



東部湯の丸SA（下り線）


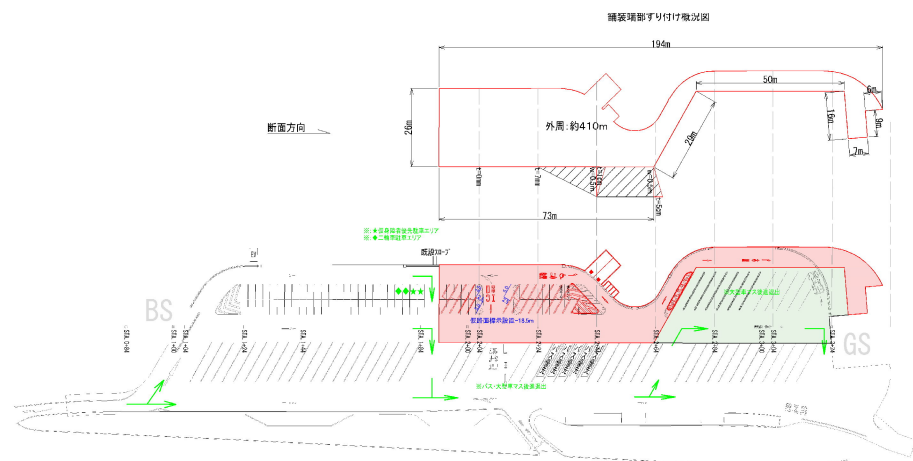


Step3 施工面積 A=2,319m ²	
計画施工日数	5日
路面標示消去(15cm換算)	- m
仮路面標示設置(W=5cm)	18.5m
仮路面標示消去(W=5cm)	- m

河川	災害監視員A	計画課長	計画課主任	支店長
色川の中流部で水防備を要	50分以上	①作業エリア内へ工事車両の入口・作業箇所等		
また中の上流部で水防備を要	45分以上	②バス、大型バス等運送員乗降所		
色川の中・上流部で水防備を要	50分以上			
→ 色川の中流部で水防備を行う方向				
「色川」	色川の中流部・上流部			
	色川上流部			
	色川下流部			


上條路自動車道 佐久管内休屋敷経路改良工事 (東部道の丸 SA下り側)			
施工ステップ図 その3			
図 尺	図号	図面番号	第 10 / 全 17
設計会社名			
施工会社名			
参画会社名	東日本高速道路株式会社 関東支社		

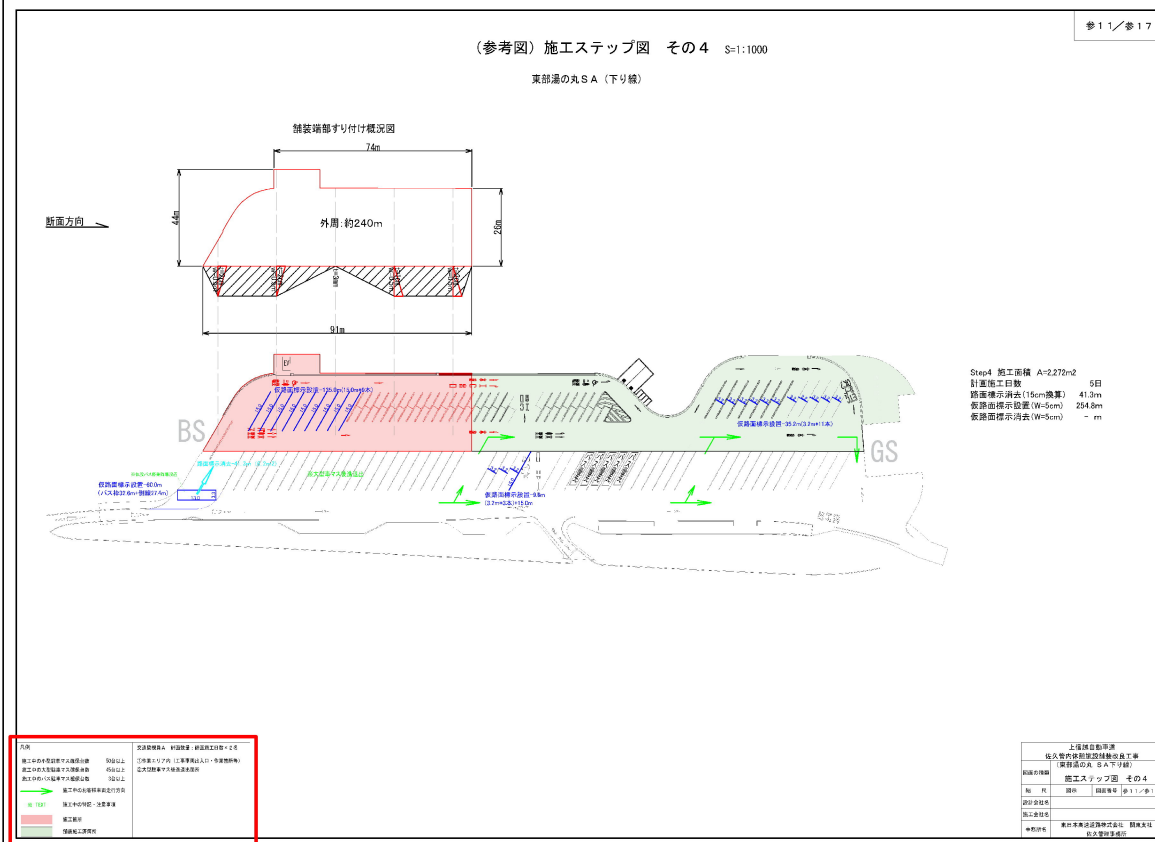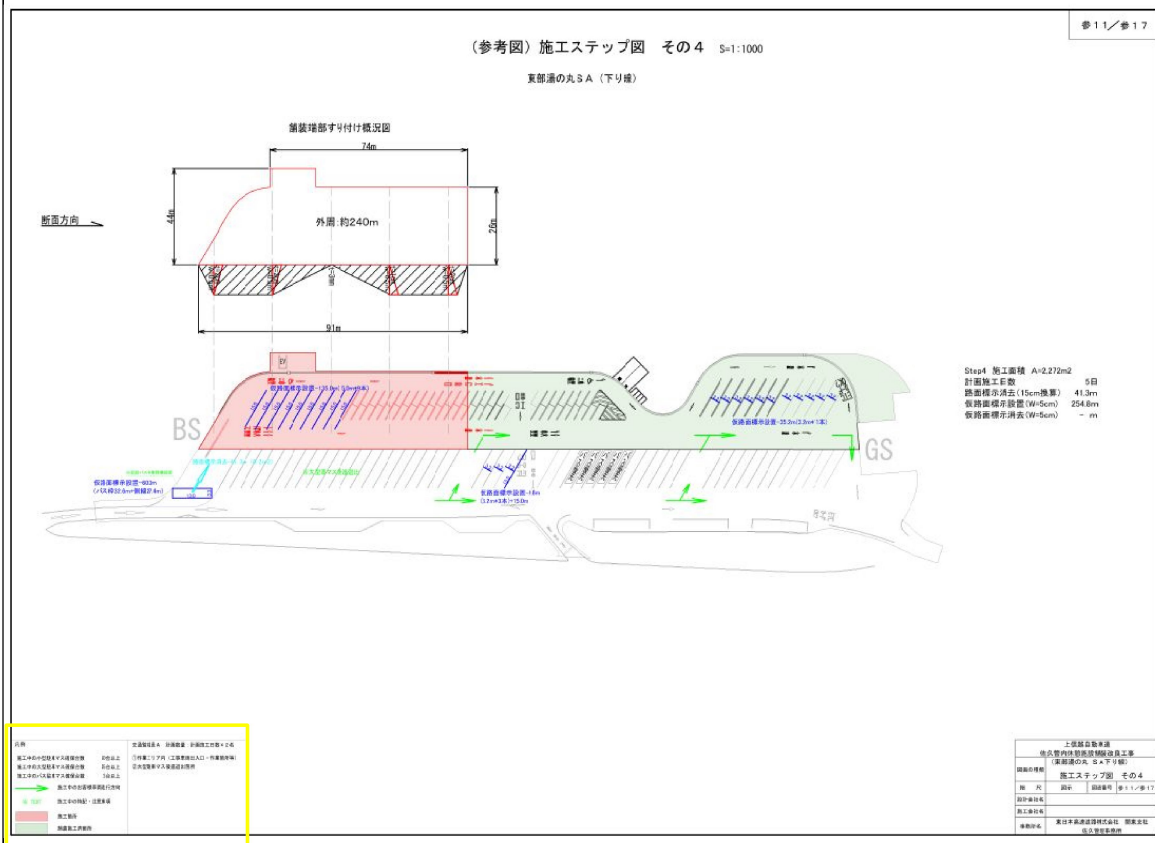

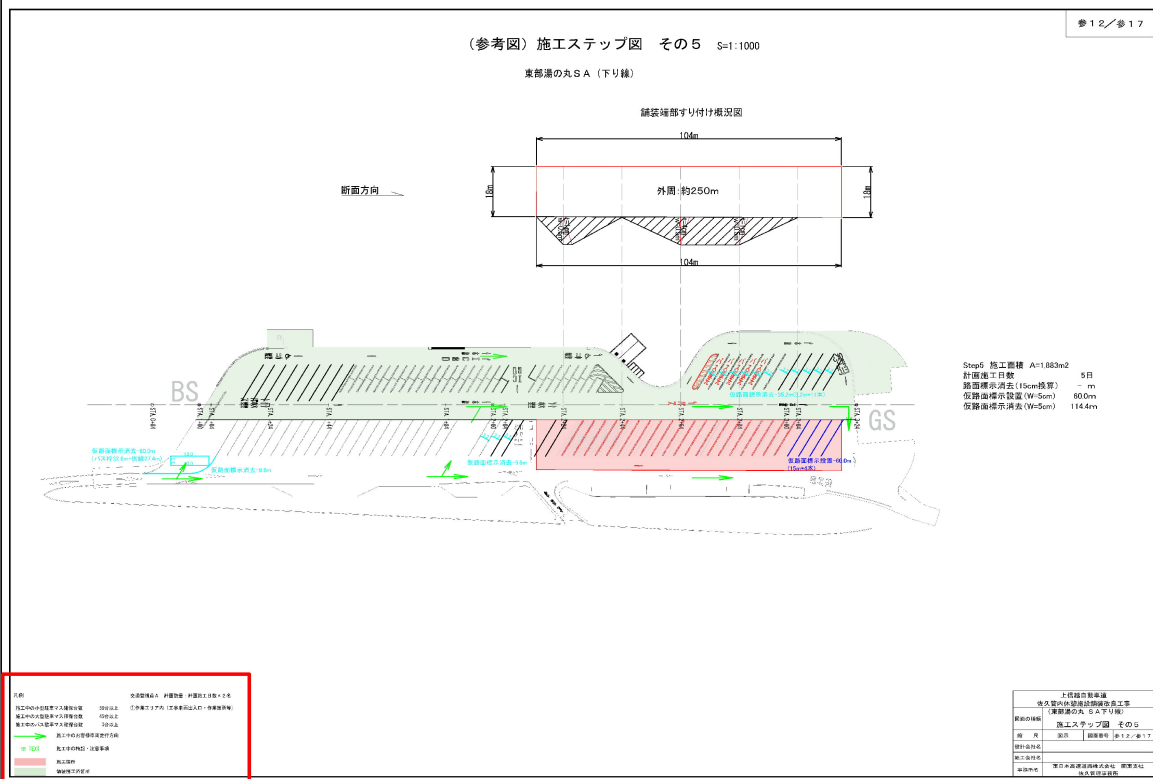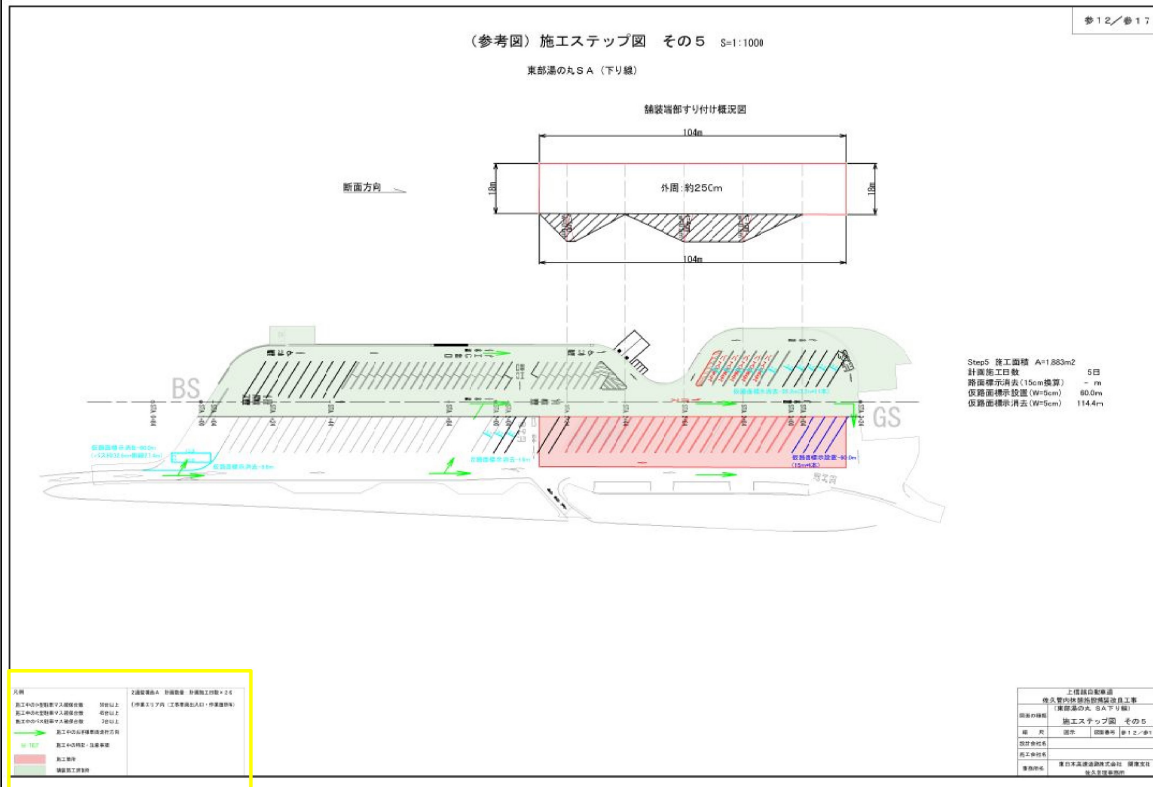


対象	設計図 参13/参17
----	-------------

誤

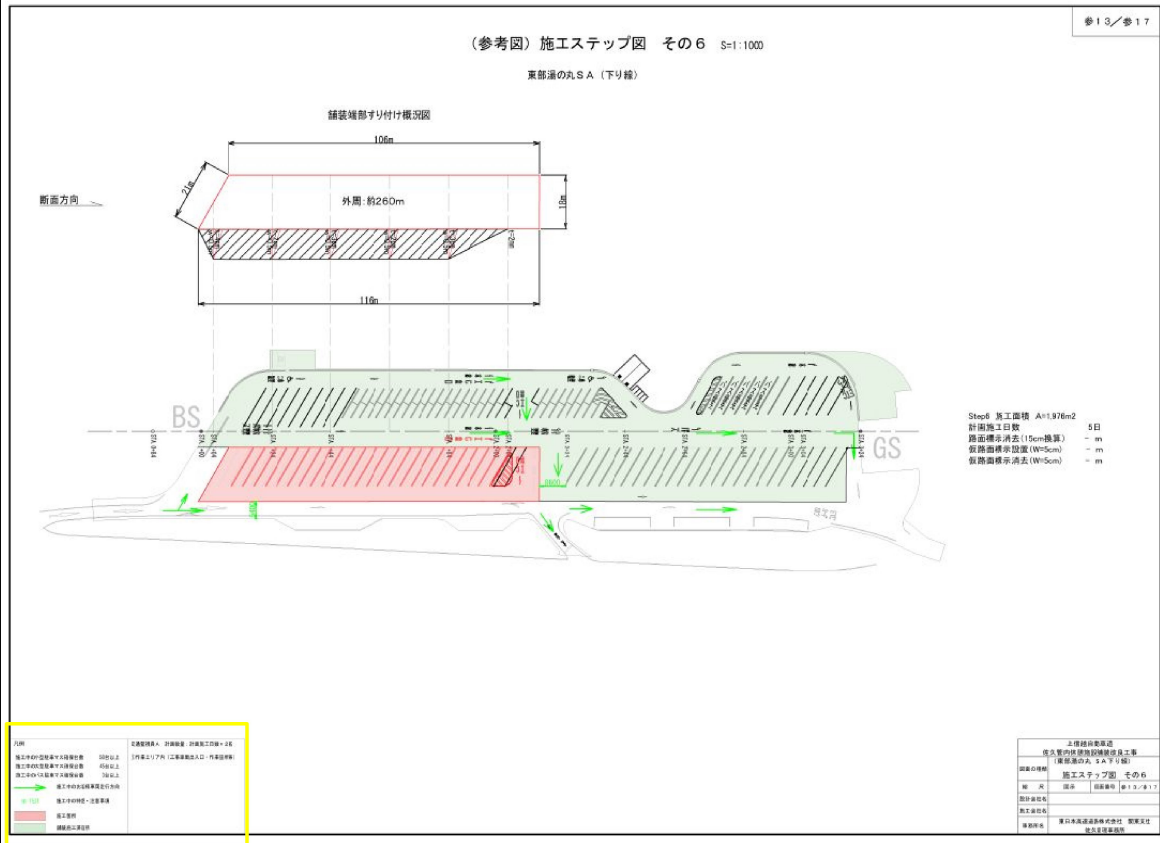


正

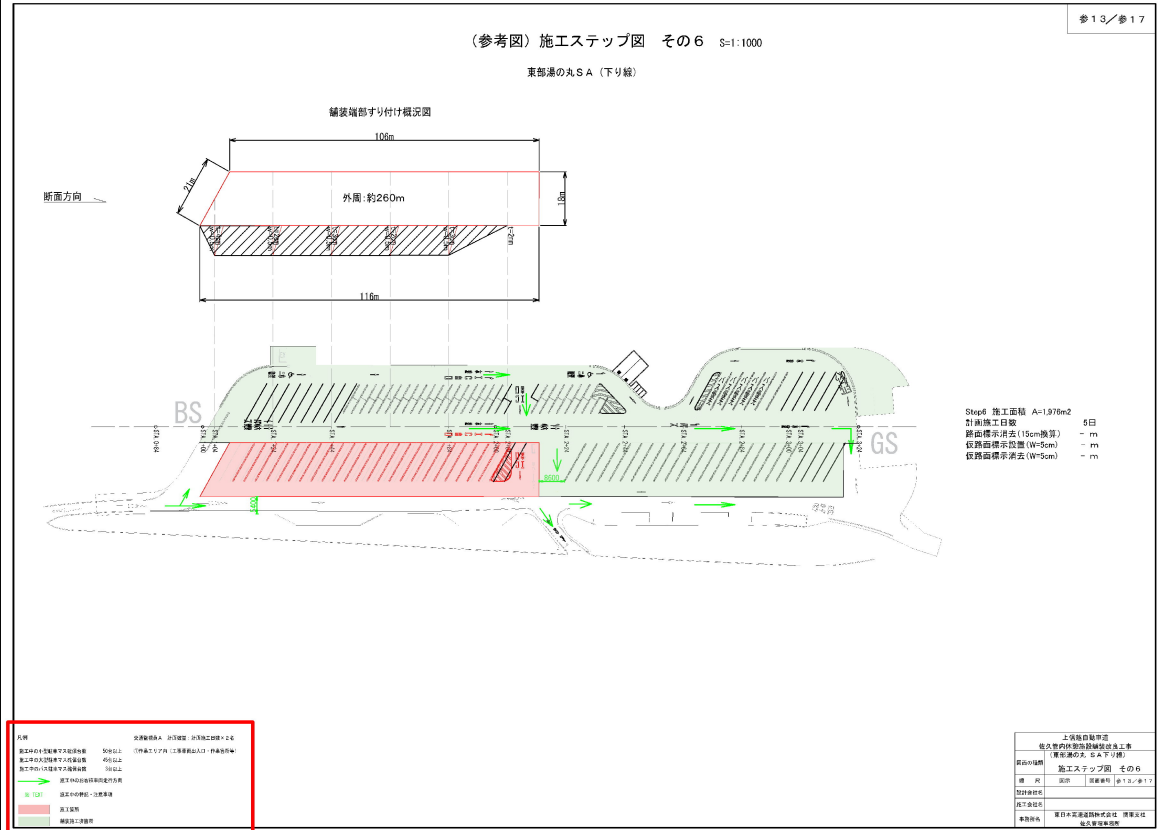


備考	文字の潰れによる図面の差替え
----	----------------

対象	設計図 参14/参17
----	-------------

誤

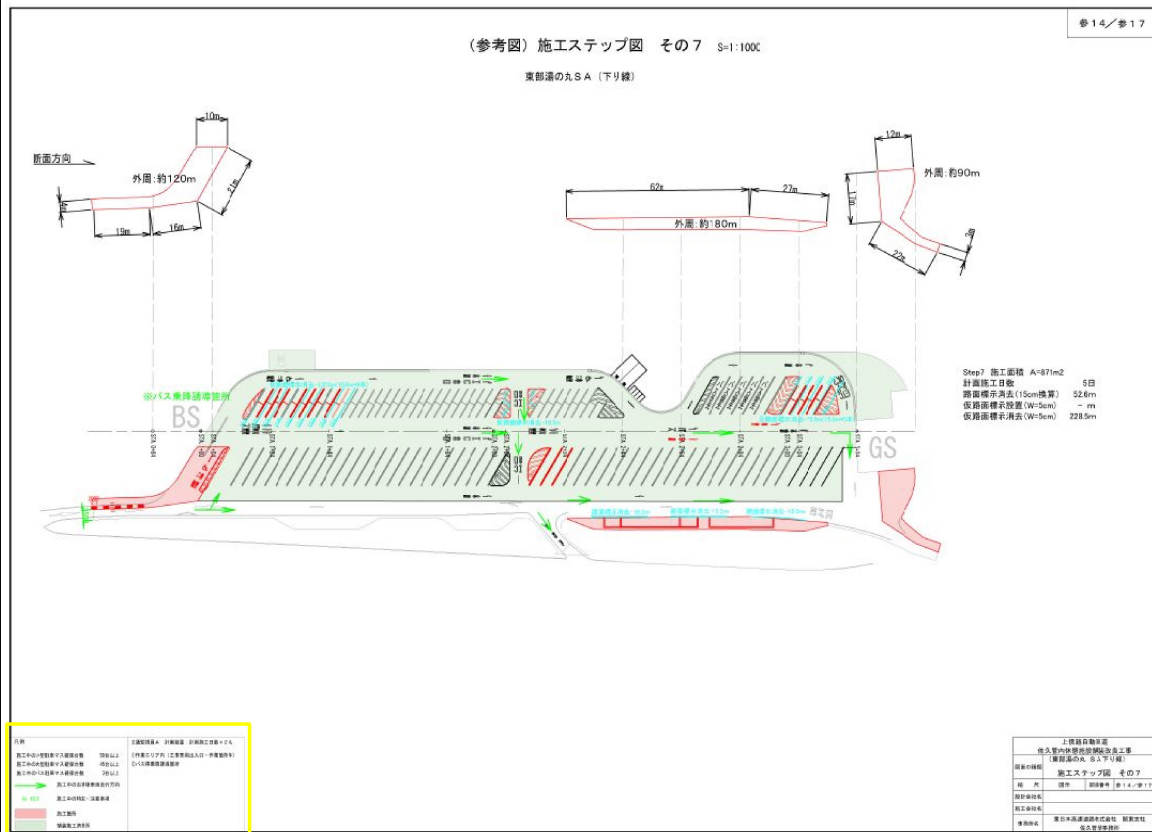


正

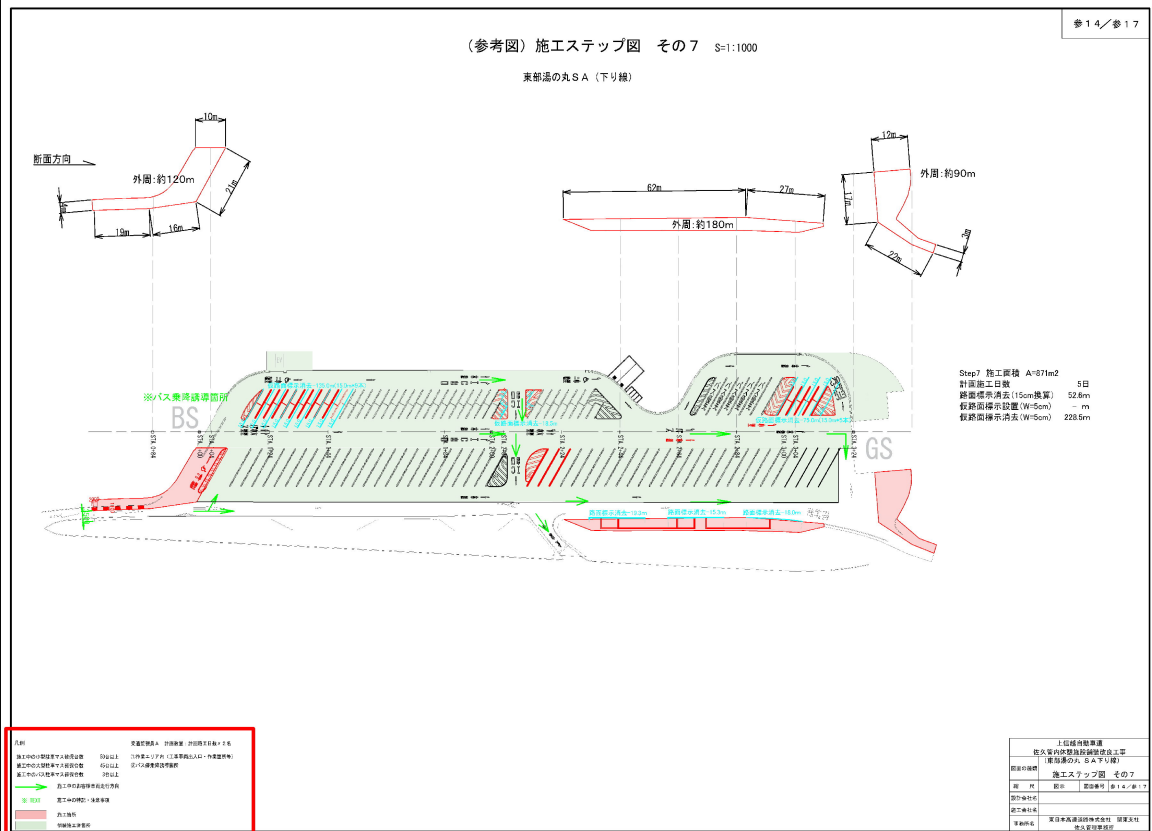


備考	文字の潰れによる図面の差替え
----	----------------

対象 設計図 参15/参17

誤

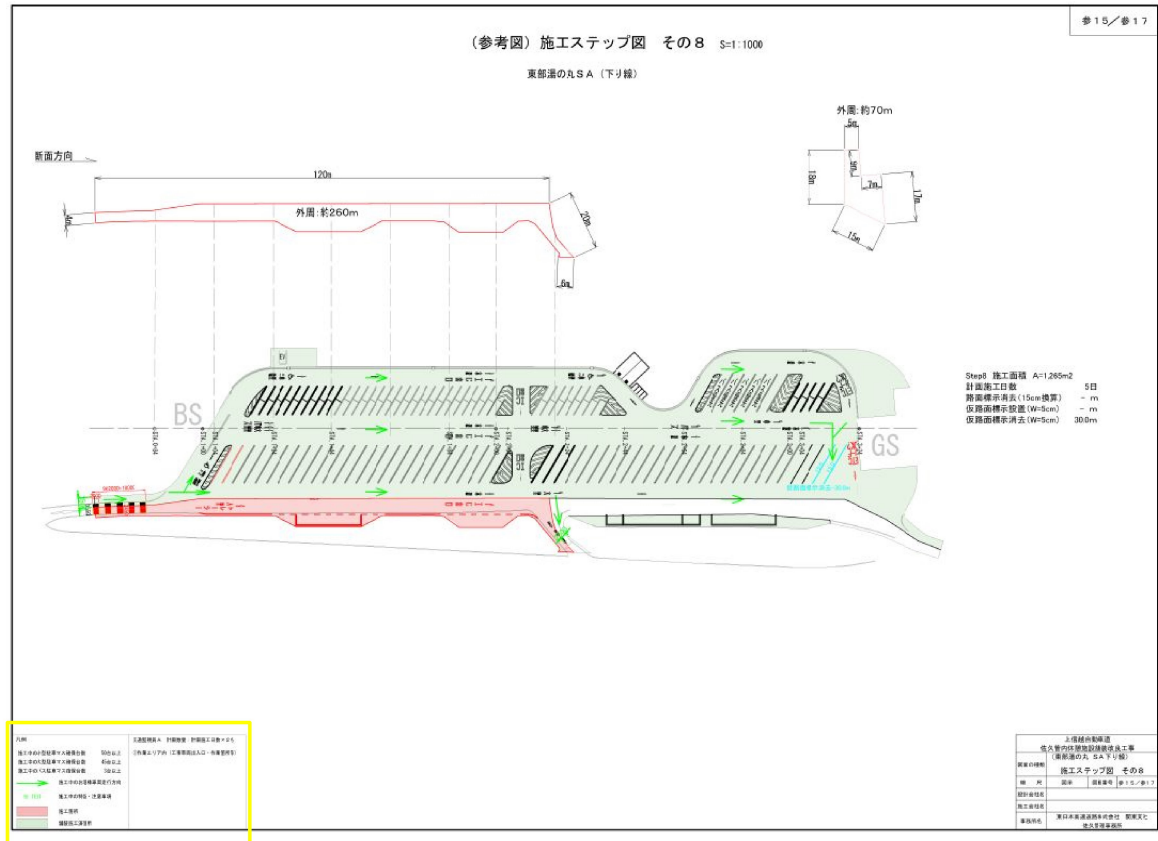


正

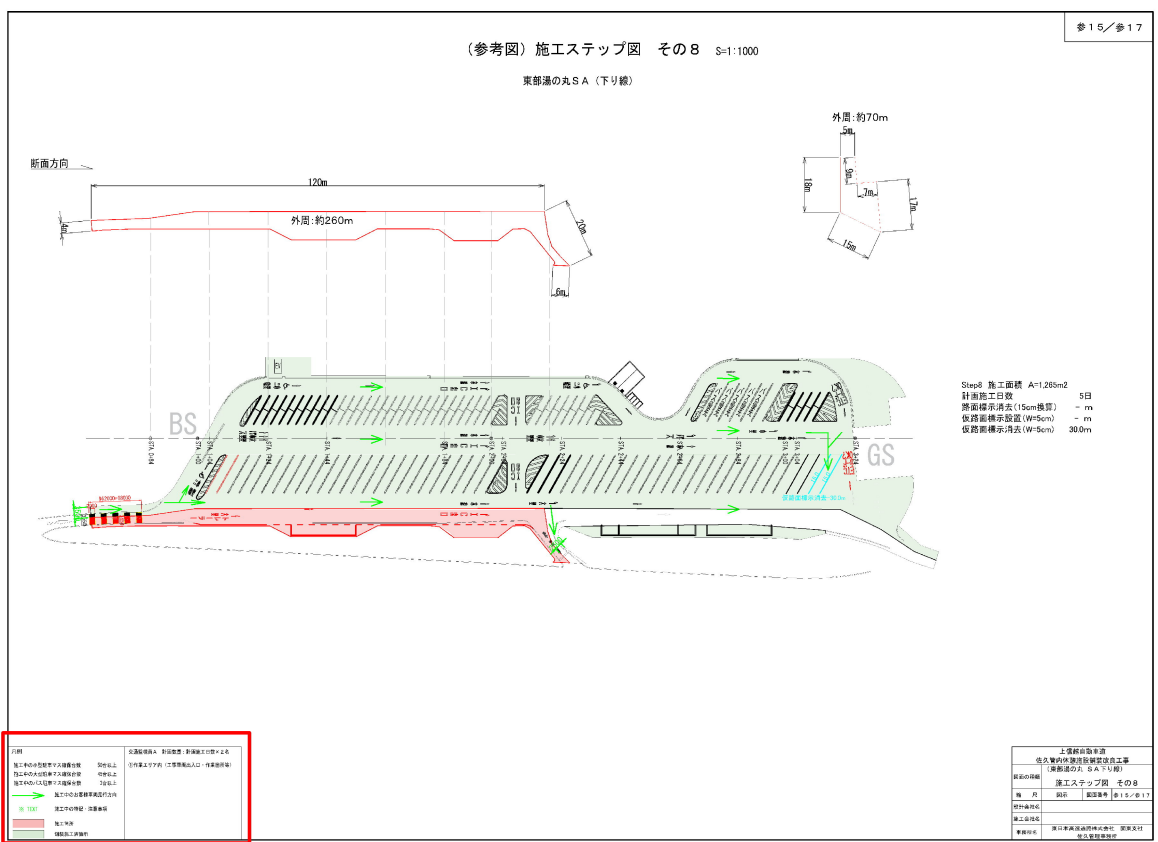


備考 文字の潰れによる図面の差替え

対象 誤	設計図 参16/参17 参16/参17 (参考図) 施工ステップ図 その9 S=1:1000 東部道の丸SA (下り線) Step9 施工面積 A=826m² 計画施工日数 5日 路面標示消去(15cm撤去) ~ m 仮設路面標示設置(W=5cm) ~ m 仮設路面標示消去(W=5cm) 30.0m <table> <tr> <th>凡例</th><th>文書管理番号 A (計画書・計画施工日数・マシ)</th></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示撤去箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示設置箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示撤去箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示設置箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示撤去箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示設置箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示撤去箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示設置箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示撤去箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示設置箇所</td><td>図面なし</td></tr> </table> <table> <tr> <th colspan="2">上級計画図表</th></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> </table>	凡例	文書管理番号 A (計画書・計画施工日数・マシ)	施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし	上級計画図表		図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号
凡例	文書管理番号 A (計画書・計画施工日数・マシ)																																												
施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし																																												
上級計画図表																																													
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
正	設計図 参16/参17 参16/参17 (参考図) 施工ステップ図 その9 S=1:1000 東部道の丸SA (下り線) Step9 施工面積 A=826m² 計画施工日数 5日 路面標示消去(15cm撤去) ~ m 仮設路面標示設置(W=5cm) ~ m 仮設路面標示消去(W=5cm) 30.0m <table> <tr> <th>凡例</th><th>文書管理番号 A (計画書・計画施工日数・マシ)</th></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示撤去箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示設置箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示撤去箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示設置箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示撤去箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示設置箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示撤去箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示設置箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示撤去箇所</td><td>図面なし</td></tr> <tr> <td>施工中の仮設路面標示設置箇所</td><td>図面なし</td></tr> </table> <table> <tr> <th colspan="2">上級計画図表</th></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> <tr> <td>図面管理番号</td><td>図面管理番号</td></tr> </table>	凡例	文書管理番号 A (計画書・計画施工日数・マシ)	施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし	施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし	上級計画図表		図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号	図面管理番号
凡例	文書管理番号 A (計画書・計画施工日数・マシ)																																												
施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示撤去箇所	図面なし																																												
施工中の仮設路面標示設置箇所	図面なし																																												
上級計画図表																																													
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
図面管理番号	図面管理番号																																												
備考	文字の潰れによる図面の差替え																																												

撤去構造物詳細図 (2)


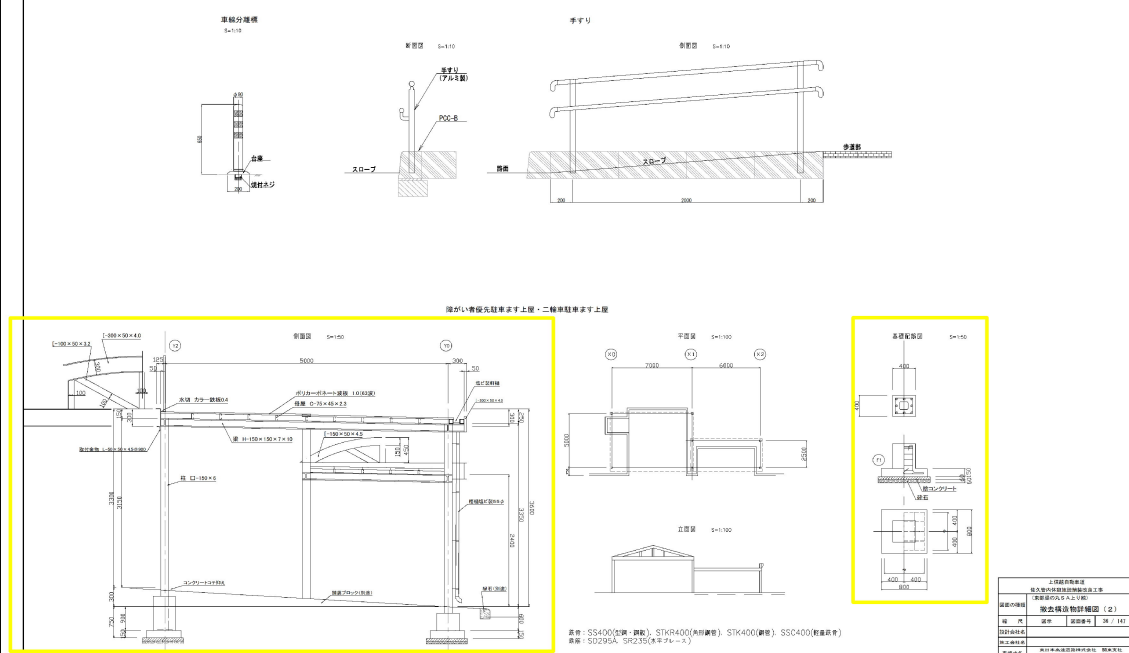


撤去構造物詳細図 (2)


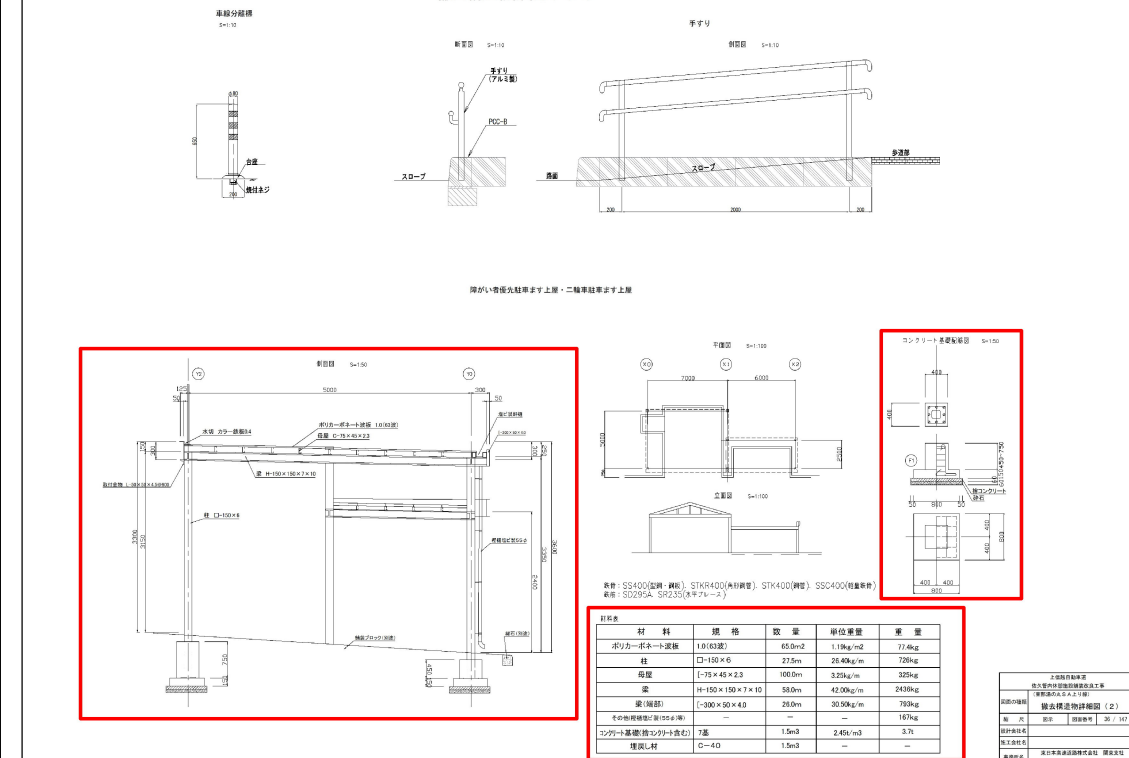


Type G
Dc⁺-S-St

Typ e B
Dc-S-0.80-0.80-





項目	規格・寸法	単位	数量	備 考
コンクリート	(1:1)	m ³	0.14	
型枠	φ	m ²	1.82	
グレーキング機	600×600×95	台	1	7-25
丸鋸	φ14×300	本	2	





項目	規格・寸法	単位	数量	備考
構造用鋼筋	産直筋	m ²	3.41	
コンクリート	25-8	m ³	1.13	
基礎砂	80-40	m ³	0.29	
型枠	5	m ²	0.07	
鉄釘	A 216	kg	3.00	
材料小計		-	4.88	

Type M
Dc ^ (GL2)-a-b-c



型 号	単位	寸 法							
		a	b	c	d	e	f	g	h
Se ~ (33.2) ~ 60.0-60.0-25	mm	600	600	1200	200	3000	3000	1425	2



項 目	規格・寸法	単位	数 量		備 考
			生 産 用 (1.12)	検 査 用	
鋼造物部材	普通鋼	m ²	5.19		
コンクリート	G1-1	m ³	9.21		
梁 ね じ	D	m ²	2.14		
グレーチング重	700×300×75	枚	1		T-25
鉄 筋 A	D16×800	kg	3.32		

型 号	単位	寸 法		
		幅	縦	寸
Bo*(R2)-0.60-0.60-1.20	mm	760	700	35



上海对外高桥港区 外高桥保税区综合开发工程			
项目名称	(原上海外高桥港区综合开发工程)		
建设单位	上海外高桥保税区开发股份有限公司		
设计单位	上海市政工程设计研究总院	设计日期	2003.12
施工单位	上海市政工程设计研究总院		

正



用・排水構造物工詳細図 (2)

Type G
Dc⁻-S-St

Т y п е
Dc-S-0,80-0,80





項目	規格・寸法	単位	数量	備考
コンクリート	21-1	m ³	0.14	
型枠	9	m ²	1.92	
グレーティング	900×900×90	枚	1	1.23





項目	規格・寸法	単位	数量	備考
構造用鉄筋	標準部	m ²	3.41	
コンクリート	部1-1	m ³	1.13	
基礎材	SD-66	m ²	0.29	
防かど	0	m ²	9.87	
塗料	A 01E	kg	3.80	
その他			0.00	

Type L • Type M



型 号	厚 度	寸 法							
		a	b	c	d	e	f	g	h
26" 30.0 x 0.0 30.0 30.0 30.0	mm	600	600	600	150	300	300	315	-
26" 30.0 x 0.0 30.0 30.0 30.0	mm	600	600	1200	200	300	3000	1425	3



材 料 表					①数量単位
項 目	規格・寸法	単位	量		備 考
			左側(上)・右側(下)	左側(下)・右側(上)	
構造物材料	普通鉄	kg	0.56	1.78	
コンクリート	C3-1	m ³	0.46	1.21	
型 枠	B	kg	4.41	7.14	
グレーディング	750×100×25	枚	1	1	1-25
鋼 筋 A	Φ16×600	kg	0.90	2.22	
②数量単位	>3	m ³	2.97	2.22	

型 号	単位	寸 法		
		W	H	t
36" (深さ: 600・600・600)	mm	900	900	75

上信越自動車道 佐久管内保野地区環境改良工事			
国庫の種別	(建設費の大半は国庫負担) 河川・排水・橋梁・物工・緑地等(1)		
施 工	図 示	図面番号	23 / 142
設計会社名			
施工会社名			
	東日本建設株式会社 建設部		

備考	「用・排水構造物工詳細図（２）」における図面の記載訂正。
----	------------------------------
